

2023년 3분기

# 민선8기 군수 공약사항 추진상황 보고서



구례군  
GURYE County





# 목 차




○ 총 관	.....	4
○ 기 획 예 산 실	.....	9
○ 문 화 관 광 실	.....	14
○ 농 업 기 술 센 터	.....	36
○ 보 건 의 료 원	.....	48
○ 주 민 복 지 과	.....	52
○ 평 생 교 육 과	.....	57
○ 종 합 민 원 과	.....	69
○ 스 포 츠 산 업 과	.....	72
○ 지 역 개 발 과	.....	78
○ 경 제 활 력 과	.....	107
○ 건 설 과	.....	112
○ 안 전 교 통 과	.....	129
○ 농 정 과	.....	134
○ 산 림 과	.....	144
○ 환 경 과	.....	157
○ 상 하 수 도 사 업 소	.....	164

# 민선8기 군수 공약사항 추진상황 보고서

## I | 보고서 개요

- 일 시 : 2023. 10. 31.(화) 14:00
- 대상기간 : 2023. 7. 1. ~ 9. 30.(2023년 3분기)
- 대상사업 : 55개 공약(58개 사업)
- 점검내용 : 추진사항, 문제점 및 대책, 향후계획 점검

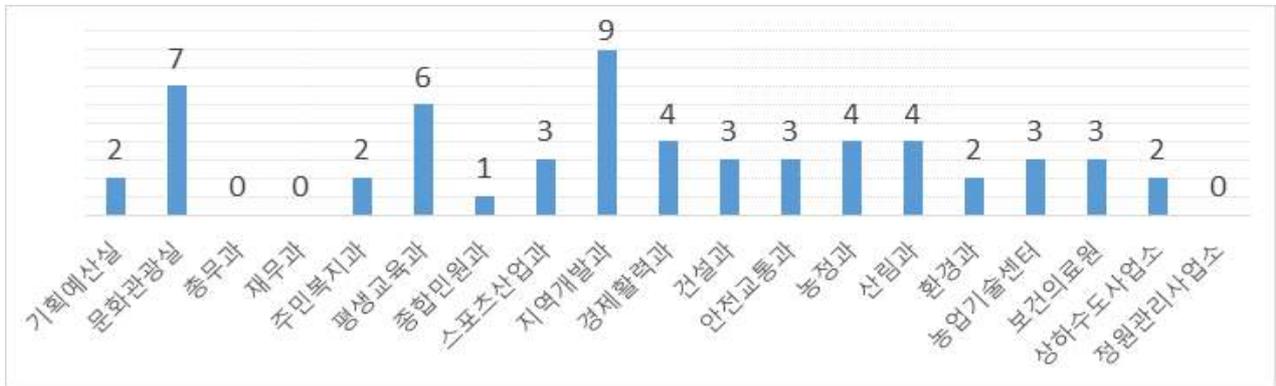

## II | 점검결과(총괄)

### ○ 추진현황(이행도)

[58개 사업 기준]

구분	총계	완 료	추진중	장기계획	재검토	비고
2023. 2분기	58	5	47	4	2	
2023. 3분기	58	7	44	5	2	

### III

## 주요 변경사항

### ① 완료 사업 (공약 취지에 맞게 사업목표를 달성한 사업)

관리번호	공약명	주요내용	비고
P8-06	생활형 영세 소상공인 카드 수수료 지원	- 카드 매출 수수료 0.5% 지원 - ('23. 9월 지원 실적) 15백만원 / 50명	'23. 3분기
P8-46	어르신 병원 진료비 지원	- 65세 이상 어르신 진료비 면제 - ('23. 10월 지원 실적) 14백만원 / 439명	'23. 3분기
P8-50	도시와 농촌 중고등학생 학력격차 해소	- 인터넷 수능방송(강남인강) 수강료 지원 - 141명 / 6,345천원	'23. 2분기
P8-52	초중고 학생 통학요금 지원	- 에듀택시 지원 - 고등학교 2개교/10백만원	"
P8-53	공동주택 시설개선 지원 확대	- 공동주택 공공시설 개보수 - 2개소 / 60백만원	"
P8-49	평생학습도시 지정 기반 구축	평생학습도시 선정(2023. 3.)	'23. 1분기
P8-51	군민 리스타트 평생직업교육 확대	평생학습도시 선정 및 교육 프로그램 운영	"

### ② 재검토 사업 (중대한 문제가 있어 추진방향에 대한 전면 재검토 필요)

관리번호	공약명	사유	부서
P8-05	지리산온천지구 에코힐링 프로젝트 추진	반려산업에 대한 주민 반대	
P8-09	공영버스 저상 전기버스 단계적 전환	운송사의 자부담 능력 결여	

### ③ 장기계획으로 분류된 사업

관리번호	공약명	사유	부서
P8-05	구례읍 상권 르네상스 사업추진	선행사업(농어촌공사, 산림조합 이전) 완료 후 추진	경제활력과
P8-09	가족형 요양타운 조성	선행사업(치유힐링 클러스터 조성) 완료 후 추진	보건의료원
P8-21	문척면 섬진강 나루장터 조성	선행사업(오산 케이블카) 완료 후 추진	경제활력과
P8-25	청춘문화공간 조성(청소년 축제)	선행사업(보행환경 개선) 완료 후 추진	평생교육과
	청춘문화공간 조성(봉성로 보행 환경 개선)	당초 공약취지와 맞지 않으므로 공약사업에서 제외하고 일반사업으로 관리 - 2023년 2분기 공약보고회 / 군수 지시사항	안전교통과

## IV

## 기타

## ① 민자 사업

관리번호	공약명	내용	부서
P8-01	구례자연드림3단지 유치	자연드림 치유 힐링 클러스터 조성	지역개발과
P8-04	기업스마트 오피스단지 조성	기업의 휴양·오피스 시설 민자 유치	지역개발과
P8-07	아이쿱 고급 치유병원 유치	만성질환, 암 등 케어전문 병원 유치	지역개발과
P8-12	오산 관광레저 클러스터 조성	오산 케이블카 설치	문화관광실
P8-17	지리산온천지구 민자 유치	지리산CC 조성, 온천호텔 신축 등	문화관광실

## ② 사업시행을 위한 주요 결정권이 외부기관에 있는 사업

관리번호	공약명	내용	부서
P8-10	공공청사 주변 집적화 추진	수요조사 결과 3개 기관 이전 희망 (경찰서, 농어촌공사, 산림조합)	지역개발과
P8-13	섬진강 리버파크 조성 (양정마을 관광형 축사 조성)	축산농가 동의 및 사업의지 필요	농정과
P8-14	지리산케이블카 유치 추진	국립공원계획 변경 승인(환경부) 필요	문화관광실
P8-18	화엄 관광르네상스(상가 재정비)	상가, 주택(57개소) 소유권 확보 필요 (대책) 지리산베이스캠프 타운 조성(지방소멸대응기금)	지역개발과
P8-26	전남도민체전 유치	선정기준에 따른 위원회 승인 필요	스포츠산업과
P8-35	국도18·19호선 확포장	국도국지도 계획 반영 필요(국토부 승인)	건설과

## 민선8기 군수 공약사항 목록(부서별)

부서	관리번호	공 약 사 항	페이지
기획예산실 (2)	P8-02	구례형 구독경제 도입으로 지역산업 연계 육성	10
	P8-11	광역 관광개발권 섬진강 통합관광 벨트 조성	12
문화관광실 (7)	P8-12	오산 관광레저 클러스터 조성	15
	P8-13	섬진강 리버파크 조성(체험시설·생태공원 조성)	18
	P8-14	지리산케이블카 국립공원계획 반영 추진	21
	P8-16	지리산온천지구 에코힐링타운 프로젝트 추진	24
	P8-17	지리산온천지구 민간자본 유치	26
	P8-22	섬진강 대숲길 야간 경관명소 조성	30
	P8-23	대한민국 풍수박물관 조성	33
농업기술센터 (3)	P8-39	청년 스마트 농업 창업지원	37
	P8-41	지리산 치유농업 캠퍼스 조성	41
	P8-45	「흙이 생명이다」전 농경지 토질 개선	45
보건의료원 (3)	<del>P8-9</del>	<del>가족형 요양타운 조성</del>	장기계획
	P8-46	어르신 병원 진료비 지원	49
	P8-54	구례군 출산가정 산후관리비 지원	51
주민복지과 (2)	P8-47	WHO 고령친화도시 조성	583
	P8-48	어르신 생활을 돕는 마을 활동가 운영	55
평생교육과 (6)	P8-8	구례농촌유학센터 조성	58
	<del>P8-25</del>	<del>청소년을 위한 청춘문화 공간 조성(청소년 축제)</del>	장기계획
	P8-49	평생학습도시 지정기반 구축	60
	P8-50	도시와 농촌 중고등학생 학력격차 해소	63
	P8-51	군민 리스타트(Restart) 평생 직업교육 확대	65
	P8-52	초중고 학생 통학요금 지원	67
종합민원과(1)	P8-53	공동주택 시설 개선 지원 확대	70
스포츠산업과 (3)	P8-26	전남도민체전 유치	73
	P8-34	구례 웰니스 복합센터 조성	75
	P8-55	취약계층을 위한 체육시설 조성	77

부서	관리번호	공 약 사 항	페이지
지역개발과 (9)	P8-01	구례자연드림3단지 유치	79
	P8-03	구례읍사무소를 중심으로 청년허브 조성	81
	P8-04	기업 스마트 오피스 단지 조성	84
	P8-07	아이쿱 고급 치유병원 유치	87
	P8-10	공공청사 군청 주변 집적화 추진	89
	P8-18	화엄 관광르네상스(블루투어·화엄상가 재정비)	91
	P8-19	친환경 자전거 인프라 구축	96
	P8-31	구례읍 도시재생사업 추진	100
	P8-32	백련천 생태문화로드 조성	104
경제활력과 (4)	<del>P8-05</del>	<del>구례읍 상권 르네상스 사업추진</del>	장기계획
	P8-06	생활형 영세 소상공인카드 수수료 지원	108
	<del>P8-21</del>	<del>문척면「섬진강 나루장터」조성</del>	장기계획
	P8-40	청년 거주시설「청년 하우스」조성	109
건설과 (3)	P8-15	지리산 피아골 순환도로 개설 완료	113
	P8-33	수해 걱정 없는 도시환경 조성	116
	P8-35	국도 18·19호선 확포장 국가계획 반영	123
안전교통과 (3)	<del>P8-25</del>	<del>청소년을 위한 청춘문화 공간 조성(보행환경 개선)</del>	장기계획
	P8-30	공영버스 저상 전기버스 단계적 전환	130
	P8-38	드론 LRS(Land, River, Sky) 실증 추진	132
농정과 (4)	P8-13	섬진강 리버파크 조성(양정 관광형 축사환경 조성)	135
	P8-42	우리밀 복합화산업 육성	137
	P8-43	읍면별 고부가가치 특화작물 육성	139
	P8-44	농특산물 유통 채널 다양화	141
산림과 (4)	P8-20	천년고찰 문화 탐방로「무소유길」조성	145
	P8-24	섬진강 사계절 무지개 꽃길 조성	148
	P8-27	견두산 MTB코스 개발 및 전국대회 유치	151
	P8-28	걷기 좋은 길「블루존 웨이」코스 개발	154
환경과 (2)	P8-18	화엄 관광르네상스(반달가슴곰 보금자리 조성)	158
	P8-29	탄소중립도시 실천 선도도시 조성	161
상하수도사업소 (2)	P8-36	구례 전역 지방상수도 공급	165
	P8-37	하수도 보급률 향상	167

# 기 획 예 산 실

**【P8-02】 구례형 구독경제 도입으로 지역산업 연계 육성**

**【P8-11】 광역 관광개발권 섬진강 통합관광벨트 조성**

**P8-02**

**구례형 구독경제 도입으로 지역산업 연계 육성**

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	7억 원	<b>사업주체</b>
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	5%	<b>추진부서</b> 기획예산실

**추진배경**

- 명예군민 자치센터\*에 등록된 명예군민을 대상으로 ‘구례를 구독’ 할 수 있는 상품을 구성·판매하여 관계인구 확대
  - \* 명예군민자치센터 : 현 읍사무소를 「그때그날 기록관」으로 조성하고 그 공간 일부를 명예군민자치센터로 조성(2024. 12월 완공 예정)하여 관광객에게 명예군민증 발급 예정
- 농·특산물, 문화예술상품, 관광상품 등 구례를 대표할 수 있는 모든 상품을 구독경제 시스템 포함하여 관계인구 확대에 기여

**사업개요**

- 사업기간: 2023 ~ 2026
  - 준비단계(2023~2024) : 협력체계 구축, 제도 정비 등
  - 운영단계(2025) : 시스템 구축·운영
- 사업내용:
  - 조례 제정, 협력체계 구축(생산자, 위원회 구성 등)
  - (운영자 선발) 사회적경제 기업을 대상으로 공개 모집·선발
  - 구독경제 온라인 시스템 구축 및 고유 디자인 개발
  - (로컬 크리에이터 연계) 컨설팅 및 신제품 개발 지원 등)
  - 마케팅, 운영체계, 상품구성 등 운영 전반에 관한 컨설팅 지원
- 사업비: 7억 원

세부사업	사업비	내역
디자인개발 및 시스템 구축	130백만원	BI개발, 시스템 구축
상품개발 및 마케팅	330백만원	신제품 개발 지원, 공모전, 광고
시스템 운영	240백만원	운영비, 제품구입비

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	700				320	190	190								
국비	660				300	180	180								
도비															
군비	40				20	10	10								
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- (구독자 확보) 군에서 추진중인 관계인구 관련 시책 검토
  - 예정 사업: 명예군민 자치센터(지방소멸대응기금 사업)
  - 시행 사업: 고향사랑기부제, 지리산종주인증제, 군 SNS, 구레소식지
- (운영) 위탁 운영자 선발을 위한 관내 사회적기업 등과 면담: 2023. 4. ~ 6.
  - 지리산씨협동조합, 노고달장, 열매장 등
- (예산확보) 인구감소지역대응 기본계획에 구독경제 반영(2023. 5.)

## □ 문제점 및 대책

- 구독자 확보, 관계성 창출·유지의 어려움
  - 구독경제 시스템은 단순히 온라인 쇼핑몰의 기능성(편의성)·수익성 보다는 ‘관계성’을 강화하는 특별한 사업목표를 가지고 있으므로 우리 군에 대한 애정과 관심을 유도할 수 있는 전략 필요
    - 기념품, 여행상품 등 매력적인 패키지 상품 구성으로 관심과 구매력 향상
    - 로컬크리에이터에게 신규 제품개발을 지원하여 최신의 트렌드를 반영한 구독상품 개발
    - 관계인구 관련시책(예: 고향사랑 기부제, 지리산 종주 인증제 등) 참여자를 구독자로 유인
- 효율적인 운영 시스템 확보 필요
  - 관내 역량있는 사회적기업을 운영자로 선발하여 위탁 운영
  - 사업의 지속성 확보를 위해 운영자의 수익구조 확보 필요

## □ 향후계획

- 지원조례 제정, 구독경제위원회 구성 등 제도 구축: 2023. 10. ~ 12.

사업부서

기획예산실장 김태곤

기획팀장 김종길(2211)

담당자 주달수(2251)

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업비</b>			
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 100%	<b>추진부서</b>	기획예산실

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. ~ 2032.
- 위 치: 섬진강 4개 지자체(구례,곡성,광양,하동)
- 추진주체: 구례,곡성,광양,하동
- 담당부서: 총괄 기획(기획예산실), 개별사업 추진(문화관광실 등)
- 사업내용: 섬진강권 4개 지자체를 연계한 통합 관광권 조성

### □ 지금까지 추진결과

- 섬진강권 통합 관광벨트 조성 업무협약 체결 : '21. 2.
  - 섬진강권 통합 관광벨트 조성 종합계획 수립 : '21. 4 ~ 10.
  - 행안부 지자체 연계 뉴딜사업 선정(40억원) : '22. 7.
  - 섬진강권 통합 관광벨트 조성을 위한 정책간담회 개최 : '22. 8.
  - 문체부 남부권 광역관광 개발계획 기본계획 반영 건의 : '22. 1 ~ 12.
  - 문체부 남부권 광역관광 개발계획 선도사업 선정 : '23. 1.
  - 섬진강 관광시대 선포 : '23. 3.
  - 봄꽃축제 연계 추진 및 모바일 스탬프 투어 실시 : '23. 3.
  - 섬진강권 4개 지자체 연계할인제 시행(13개소) : '23. 3.
  - 문체부 남부권 광역 관광개발계획 반영 : '23. 7.
- 4개 지자체 1,133억원 / 구례군 329억원 확보

## □ 문제점 대책

### ○ S/W 사업 추진에 대한 지자체 의지 부족

- 섬진강 통합 관광벨트 조성을 위한 H/W 사업인 지역거점 조성 예산은 문체부 남부권 광역관광개발계획으로 확보되어 추진중에 있음
  - H/W 사업보다 중요한 것이 섬진강권 4개 지자체의 자원을 엮어 하나의 관광권을 조성함으로써 체류형 관광을 활성화시키는 것인데 S/W 사업 발굴에 대한 시군 의지가 높지 않음
- 4개 지자체장 간담회를 통해 섬진강 관광시대 도약을 위한 추진 의지를 다지고 연계 관광정책을 개발해야 함
- 4개 지자체 연계 관광의 경우 타 지자체와 기 추진하는 연계 정책보다 파격적인 인센티브 정책 필요

## □ 향후계획

### ○ 4개 지자체 장 간담회 개최(11월 중)

- 금년도 중 4개 지자체 장 간담회를 통해 4개 시군 연계 의지 강화

### ○ 지속적인 실무협의회 개최를 통한 연계사업 발굴

- 실무협의회 개최를 통해 지자체 간 연계 관광정책 발굴

### ○ 4개 지자체 주관 시군 변경(구례→하동)

- 매년 주관 시군을 변경하기로 협의했으나 초기 정착을 위해 ‘21년부터 구례군에서 섬진강권 통합 관광벨트를 주관해오고 있음
- H/W 사업비 확보 뿐 아니라 섬진강 관광시대 선포 등 통합관광벨트 조성을 위한 기본 바탕 조성을 완료하였기에 타 지자체 관심 제고를 위해 ‘24년부터 주관 시군을 매년 변경하여 운영

# 문화관광실

- 【P8-12】 오산 관광레저 클러스터 조성
- 【P8-13】 섬진강 리버파크 조성(체험시설·생태공원 조성)
- 【P8-14】 지리산케이블카 국립공원계획 반영 계획
- 【P8-16】 지리산온천지구 에코힐링타운 프로젝트 추진
- 【P8-17】 지리산온천지구 민간자본 유치
- 【P8-22】 섬진강 대숲길 야간 경관명소 조성
- 【P8-23】 대한민국 풍수박물관 조성

지역의 우수한 생태경관 자원인 오산(명승 제111호)과 섬진강을 활용한 관광인프라 구축

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	2,000(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	15%	<b>추진부서</b>	문화관광실

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 사업장소: 구례읍 봉서리 ~ 문척면 월전리 일원 (오산권역 일원)
- 사업비: 2,000억 원(도비 130, 군 214, 민간투자 1,656)
- 사업내용: 오산케이블카, 섬진강힐링생태공원조성, 스카이바이크 스카이서퍼, 오산명소화, 오산대불조성사업 등

□ 세부계획

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오산 케이블카 설치사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2021. 1. ~ 2025. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 ~ 문척면 사성암 일원</li> <li>· 사업량: 케이블카 L=2.34km</li> <li>· 사업비: 541억 원(군비 71, 민간투자 470)</li> <li>· 추진내용: 군 관리계획변경 용역 추진 중</li> </ul> </li> </ul>	<p>현 공정률 30%</p>

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 섬진강 힐링 생태공원 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 145-6 일원</li> <li>· 사업량: 힐링생태공원조성 A=41,862㎡</li> <li>· 사업비: 93억 원(도비 40, 군비 53)</li> <li>· 추진내용: 총괄분 및 1,2차분 공사 중</li> </ul> </li> </ul>	공사중 15%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오산 명소화 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>· 사업장소: 문척면 죽마리 오산 일원</li> <li>· 사업량: 탐방로정비 L=2.0km, 환경개선 A=20,000㎡</li> <li>· 사업비: 50억 원(도비 25, 군비 25)</li> <li>· 추진내용: 총괄분 및 2차분 공사 중</li> </ul> </li> </ul>	공사중 53%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 섬진강 스카이 바이크 설치사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 원방리 104-17 ~ 문척면 죽마리 417-2 일원</li> <li>· 사업량: 스카이 바이크 설치 L=0.37km(6개 라인)</li> <li>· 사업비: 40억 원(도비 20, 군비 20)</li> <li>· 추진내용: 총괄분 및 1,2,3차분 공사 중</li> </ul> </li> </ul>	현 공정률 35%
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 섬진강 익사이팅 시설 조성사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 145-6 일원</li> <li>· 사업량: 익스트림 체험시설 L=970m</li> <li>· 사업비: 50억 원(도비 25, 군비 25)</li> <li>· 추진내용: 실시설계용역 추진 중(체험시설 종류 선정 중)</li> </ul> </li> </ul>	설계중 10%

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 오산 사성암 대불 조성사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2021. 11. ~ 2025. 12.</li> <li>· 사업장소: 문척면 죽마리 사성암 일원</li> <li>· 사업량: 대불조성 1식</li> <li>· 사업비: 50억 원(도비 20, 군비 20, 민자 10)</li> <li>· 추진내용: 기본설계완료</li> </ul> </li> </ul>	사업종료

□ **지금까지 추진사항**

- 2022. 12.: 오산 명소화 조성사업 총괄분 및 1차분 착공
- 2023. 6.: 섬진강·지리산 관광인프라 구축사업 투자협약체결  
{구례군·도펠라이어/가라벤타그룹, 대원플러스그룹(주)}
- 2023. 9.: 오산 명소화 조성사업 1차분 준공 및 2차분 발주

□ **향후계획**

- 2023. 12.: 오산케이블카 설치사업 - 군 관리계획변경(사업인가) 완료
- 2024. 12.: 섬진강스카이바이크 설치사업, 오산명소화 조성사업, 섬진강힐링생태공원 조성사업 준공
- 2025. 3.: 오산케이블카 설치사업 - 실시계획인가 완료
- 2025. 5.: 오산케이블카 설치사업 착공
- 2026. 10.: 오산케이블카 설치사업 준공 및 정상 운영

사업부서

문화관광실장 강봉길    관광개발팀장 김병근(2542)    담당자 김종일(2544)

**P8-13**

**섬진강 리버파크 조성**

지역 섬진강권 통합 관광벨트 조성을 위한 구례군 핵심거점 및 오산케이블카 사업이 지역과 연계될 수 있는 활성화 공간 조성

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	(293억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b>	문화관광실

□ **사업개요**

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업장소: 구례읍 봉서리 섬진강 잔디포 일원
- 사업비: 293억 원(국비 146.5, 군 146.5)
- 사업내용: 섬진강 생태교육장 및 생태정원 조성, 섬진강 스마트 공유 스테이션 조성, 그린케이션 관광스태이 사업

□ **세부계획**

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 섬진강 스마트 공유 스테이션 조성                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 일원</li> <li>· 사업량: 공유 스테이션 조성 1식</li> <li>· 사업비: 50억 원(국비 25, 군비 25)</li> <li>· 추진내용: 보상 및 관리계획 변경 용역 추진</li> </ul> </li> </ul>	추진중

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 섬진강 생태교육장 및 생태정원 조성               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 섬진강 잔디포 일원</li> <li>· 사업량: 생태교육장 및 정원조성 1식</li> <li>· 사업비: 20억 원(국비 10, 군비 10)</li> <li>· 추진내용: 섬진강통합관광벨트조성 기본구상 추진</li> </ul> </li> </ul>	구분구상 용역 추진중
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 그린케이션 관광스테이 사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.</li> <li>· 사업장소: 구례읍 봉서리 101번지 일원</li> <li>· 사업량: 아트워케이션 센터 1동, 공원 및 주차장 20,000㎡, 파빌리온 3,000㎡, 지붕위 미술관 등</li> <li>· 사업비: 226억 원(국비 113, 도비 34, 군비 79)</li> <li>· 추진내용:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본구상 및 타당성 조사 용역 추진</li> <li>- 중앙투자심사 진행 중</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	중앙투자심사 진행중

□ **지금까지 추진사항**

- 2023. 5.: 그린케이션 관광스테이 확충사업 기본구상 용역 추진
- 2023. 3. ~ 6.: 섬진강 스마트 공유스테이션 조성사업 투자심사(전남도)
- 2023. 8.: 중앙투자심사(행안부) 심의 신청
- 2023. 9.: 섬진강 스마트 공유스테이션 조성사업 기본 및 실시설계용역 추진

□ **향후계획**

- 2023. 12.: 그린케이션 관광스테이 확충사업 투심완료
- 2026. 12.: 섬진강 스마트 공유스테이션 조성, 생태교육장 및

<b>사업부서</b>	문화관광실장 강봉길    관광레저팀장 이흥우(2336)    담당자 오승규(2778)
-------------	---

# 계 획 도



# 계 획 도 (그린케이션 관광스테이 확충)



**P8-14**

**지리산케이블카 국립공원계획 반영 계획**

- 침체된 지역경제 활성화를 위해 특색있는 친환경 관광상품 개발
- 국립공원 탐방객 수 조절 및 지리산 관통도로 폐쇄로 지리산 국립공원 환경 보호

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	641(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b> 문화관광실

**사업개요**

- 위 치: 지리산 온천지구 ~ 성삼재 주차장
- 사 업 량: 3.7km(공원 외 2.6km, 공원 내 1.1km)
- 사 업 비: 641억 원
- 사업내용: 순환식 케이블카(16인승 27대), 정류장 2개소
  - 삭도추진계획 기본구상 및 타당성조사 후 국립공원계획변경(안) 수립
  - 국립공원계획변경(안) 환경부 접수 추진

**예산계획**

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	64,100			150	250			63,700							
국비															
도비															
군비	64,100			150	250			63,700							
기타															

□ **지금까지 추진사항**

- 2021. 11.: 케이블카 설치 신청(군 → 환경부)
- 2022. 6.: 케이블카 설치 신청 반려(환경부 → 군)
- 2022. 7.: 케이블카 설치를 위한 산청군 업무협의
- 2023. 5.: 국립공원계획변경(안) 용역 착수

□ **문제점 및 대책**

- ‘12년 본 사업에 대한 환경부 조건 이행 불가  
(4개 시·군 1개소로 협의)  
⇒ 삭도위치 변경(안) 등을 포함한 국립공원계획 변경 신청

□ **향후계획**

- 2023. 11.: 국립공원계획변경(안) 및 환경영향평가 용역 완료
- 2023. 12.: 국립공원계획변경(안) 환경부 접수

# 조감도



# 위치도



**P8-16**

**지리산온천지구 에코힐링타운 프로젝트 추진**

지리산온천지구의 온천관광수요가 급감하고 힐링과 레저의 관광 수요가 늘어남에 따라 웰니스 관광거점 조성 필요

<b>사업구분</b> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b> 임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b> 국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b> 예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b> 100(억 원)	
<b>추진상황</b> 완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 5%	<b>추진부서</b> 문화관광실

**□ 사업개요**

- 사업명: 지리산온천지구 에코힐링타운 조성
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 사업장소: 산동면 지리산온천지구 일원
- 사업비: 100억 원(국비 50, 군 50)
- 사업내용: 온천수 뷰티, 아토피, 반려동물 치유 등

**□ 예산계획**

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	10,000				3,000	3,000	4,000					100			
국비	5,000				1,500	1,500	2,000								
도비															
군비	5,000				1,500	1,500	2,000					100			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 2022. 9. ~ 2023. 4.: 지리산 온천지구 에코힐링타운 종합계획 수립
- 2023. 5.: 지리산 온천지구 에코힐링타운(지리산 펫 웰니스파크 조성사업) 주민설명회 개최

## □ 문제점 및 대책

- 전남 균형발전 300프로젝트 공모사업 신청을 위한 주민설명회 ('23. 5. 8.) 시 주변주민들 대부분 반려산업에 대한 인식이 좋지 않아 부정적인 반대의사를 밝힘
- ⇒ 주민동의를 필수조건인 공모사업 신청이 불가함에 따라 새로운 사업을 모색할 계획임

## □ 향후계획

- 2023. 7. ~ 12.: 신규사업 계획 수립
- 2024. 1.: 공모사업 신청
- 2024. 5.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 1.: 지리산 온천지구 에코힐링타운 조성사업 착공
- 2026. 12.: 지리산 온천지구 에코힐링타운 조성사업 준공

지리산온천지구 민간자본 유치를 위해 공공과 민간부분으로 나누어 투자유치 추진

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	2,134(억 원)	<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □
<b>추진상황</b>	완료 □ 정상추진 ■	<b>추진율</b>	15%	<b>추진부서</b>	문화관광실

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 12.
- 사업장소: 산동면 지리산온천지구 일원
- 사업비: 2,134억 원(국비 57, 군 77, 민간자본 2,000)
- 사업내용: 공공과 민간부분으로 나누어 투자유치 추진

□ 세부계획

《공공분야》

사 업 개 요	추진상황
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산동 명소화 조성사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12.</li> <li>· 사업장소: 산동면 좌사리 산수유사랑공원 일원</li> <li>· 사업량: 기념탑 및 물놀이장조성 1식</li> <li>· 사업비: 50억 원(국비 25, 군비 25)</li> <li>· 추진내용: 총괄분 및 1,2차분 공사 중</li> </ul> </li> </ul>	공사 중 21%

사 업 개 요	추진상황
○ 산수유 체험마당 조성사업 • 사업기간: 2022. 1. ~ 2024. 12. • 사업장소: 산동면 좌사리 산수유사랑공원 일원 • 사 업 량: 미로원조성 1식 • 사 업 비: 40억 원(국비 20, 군비 20 ) • 추진내용: 총괄분 및 2,3,4차분 공사 중	공사중 21%
○ 지리산온천관광지정비사업 • 사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 12. • 사업장소: 산동면 좌사리 일원 • 사 업 량: 도로개설 1식 • 사 업 비: 14억 원(국비 7, 군비 7) • 추진내용: 공사 중	공사중 65%

### 《민간분야》

- 지리산온천관광지 조성계획(변경)승인(2022. 1. 7.)으로 민간 투자 여건이 마련됨 (여관용지 → 관광펜션)
- 구례온천C.C.조성사업 업무협약 체결(2023. 3. 23.) - 1,000억원 규모 {구례군, (주)피아웰니스, (주)삼미건설}
- 지리산온천관광호텔 양도·양수 후 풀 빌라형 호텔 신축  
 ※ 2,000억원 규모 투자유치 (리조트 신축)

### □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	213,400		8,200	1,650	53,550	50,000	100,000		13,780	9,330	2,800	1,650			
국비	5,700		2,600	825	2,275				7,110	4,885	1,400	825			
도비															
군비	7,700		5,600	825	1,275				6,670	4,445	1,400	825			
기타	200,000				50,000	50,000	100,000								


## □ 지금까지 추진사항

- 2022. 12.: 산동지구 명소화 조성사업 착공
- 2023. 1.: 지리산 온천관광지 정비사업 착공
- 2023. 3.: 구례온천C.C.조성사업 업무협약 체결(2023. 3. 23.)

## □ 향후계획

- 2023. 12.: 지리산 온천관광지 정비사업 준공
- 2024. 1.: 구례온천C.C.조성사업 사업시행자 지정 및 실시계획 인가 신청
- 2024. 12.: 산수유 체험마당 조성, 산동지구 명소화 조성 사업 준공
- 2025. 1.: 구례온천C.C.조성사업 실시계획 인가 고시
- 2025. 2.: 구례온천C.C.조성사업 착공
- 2025. 1. ~ 12.: 지리산 온천지구 민간자본 투자 유치 추진
- 2026. 12.: 지리산온천관광호텔신축 투자유치 성공
- 2026. 12.: 구례온천C.C.조성사업 준공 및 개장

# 위치도

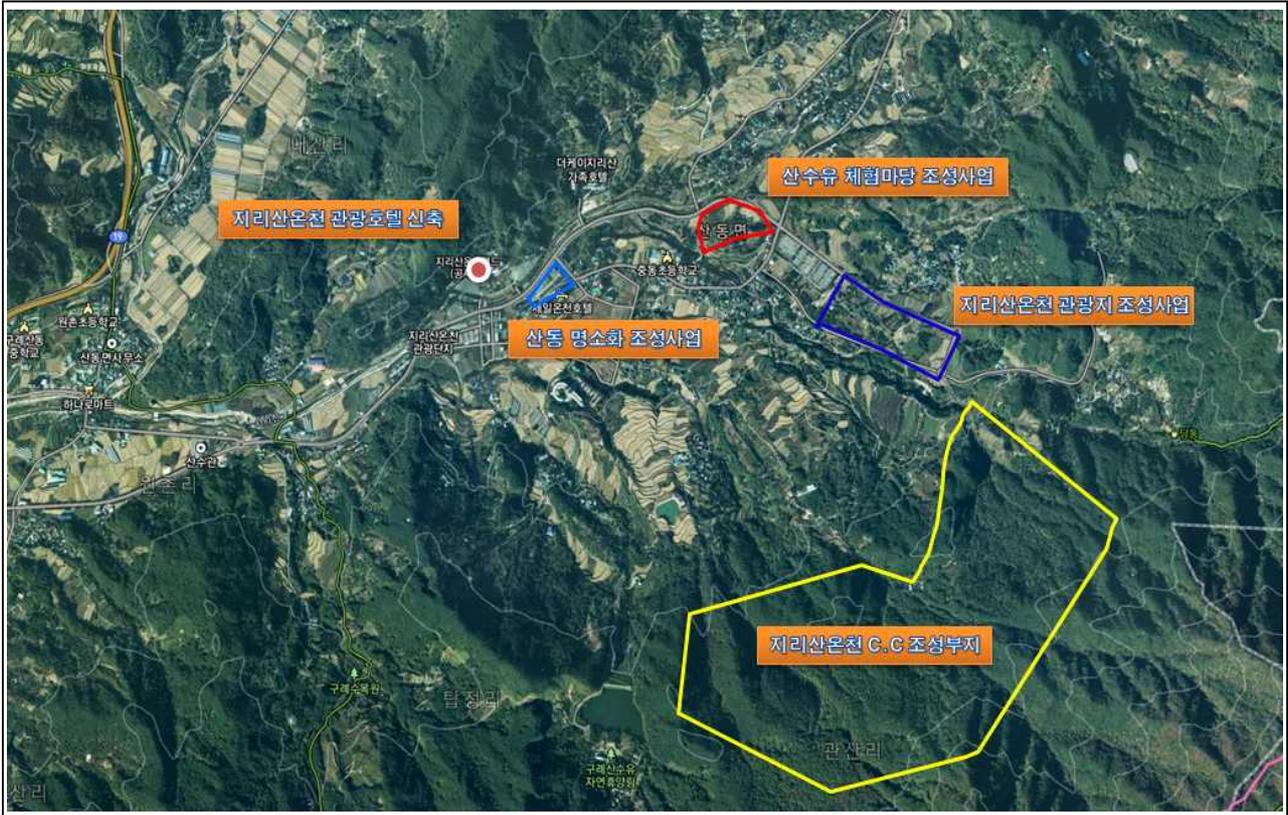

- 섬진강 대숲길 권역에 대한 관광상품화 추진
- 기 조성된 관광자원과 야간 조명 활용한 주·야간 관광상품 개발
- 전라남도 경관지구 특화사업 공모사업으로 예산 확보

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	54(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	5%	<b>추진부서</b>	문화관광실

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. ~ 2025.
- 사업장소: 섬진강 대숲길 일원
- 사 업 비: 5,383백만 원(도비 2,644, 군비 2,739)
- 사업내용
  - 대숲길 권역에 기 조성된 자원과 주변의 개발중인 관광개발사업을 연계한 관광상품화 추진
    - ▶ (기 조성) 대숲길조성, 섬진강야간 경관조명설치, 포토존 설치
    - ▶ (추진·계획중인사업)섬진강힐링생태공원, 스카이스피어·마이크, 스마트 복합쉼터, 오산케이블카조성사업, 등
  - 전라남도 경관지구 특화사업 공모를 통해 섬진강 대나무숲길 경관 명소 조성
  - 야간 관광객 유치를 위한 야간 관광상품화 프로그램 운영

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,383	333		50	400	4,600									
국비															
도비	2,644	144			200	2,300									
군비	2,739	189		50	200	2,300									
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 섬진강 야간 경관조명 설치(2021): 1식, 288백만 원
- 섬진강 대숲길 포토존 설치(2021): 2개소 45백만 원
- 2023. 9.: 섬진강 대숲길 야간경관명소 조성 공유재산 심의회
- 2023. 10.: 섬진강 대숲길 야간경관명소 조성 투자심사

## □ 문제점 및 대책

- 대숲길 주변은 하천변과 인접되어 있어, 쉼터와 포토존 설치는 기반시설에 해당되어 하천점용 취득해야 함
  - ⇒ 군 관리시설 내 및 하천구역 아닌 곳 집중 발굴 및 활용
  - ⇒ 경관이 좋은 섬진강변 등에 구조물 설치 시 관계기관에 필요성을 설명하여 연차별로 설치
- 추진중인 사업이 완료되는 시기에 맞춰 대숲길 야간 경관명소 집중 홍보 및 운영
  - ※ 섬진강힐링생태공원(2023년), 스카이스피어·바이크(2024), 스마트 복합쉼터(2023), 오산케이블카 조성사업(2024)
  - ⇒ 2023년까지는 기 조성된 야간 경관자원과 주변자원을 활용한 관광상품 위주로 운영
  - ⇒ 2024년 이후 대숲길과 섬진강 레저·휴양시설을 활용한 종합적인 관광상품 운영

## □ 향후계획

- 2024. 1.: 섬진강 대숲길 야간경관명소 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 6.: 섬진강 대숲길 야간경관명소 조성사업 착공
- 2025. 12.: 섬진강 대숲길 야간경관명소 조성사업 완료

**P8-23**

**풍수문화체험관 조성**

풍수지리학의 대가 도선국사가 구례에 남긴 발자취와 연계한 풍수 문화체험관 조성

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 외 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	50(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	5%	<b>추진부서</b> 문화관광실

**사업개요**

- 기 간: 2023. 01. ~ 2027. 01.
- 장 소: 구례군 문천면 금정리 산192번지 일원(예정)
- 사업비: 5,000백만 원
- 내 용:
  - 풍수문화를 주제로 하는 복합문화관 조성

**예산계획**

- 국비·도비 지원 근거 모색

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	5,000			50	1,650	1,650	1,650		50						
국비															
도비															
군비	5,000			50	1,650	1,650	1,650		50			50			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

### ○ 사업예정부지 2차례 답사

- 도보 접근(※도로 없음), 왕복 거리 2~3km, 소요시간 90~100분

### ○ 입지 분석 후 서면보고

- 보전산지 내 문화 및 집회시설 건립 불가(※산림공익시설만 가능)
- 매장문화재 유존지역 지정 가능성 높음
- 접근 방법, 입지 여건, 현장 상황 등 보고

## □ 향후계획

### ○ 대체 사업 예정 부지 모색

## □ 문제점 대책

### ○ 사업예정부지가 보전산지임에 따라 문화 및 집회시설 건립 불가

### ○ 문화체육관광부 지원 예산 중 풍수문화와 연결할 수 있는 사업이 불명확함

## 현황사진



## 위치도



# 농업 기술 센터

**[P8-39] 청년 스마트 농업 창업지원**

**[P8-41] 지리산 치유농업 캠퍼스 조성**

**[P8-45] 「흙이 생명이다」 전 농경지 토질 개선**

청년농업인 유입 및 스마트팜 창업을 유도 할 청년 스마트팜 임대농장 운영과 창업지원 연계

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	4억 원	<b>추진부서</b>	농업기술센터
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □	<b>추진율</b>	40%		

□ 사업개요

○ (경영실습) 스마트팜 창업 의향 청년에 스마트팜 온실 임대

- 위 치: 구례군 구례읍 봉서리 890-3번지(부지면적 2,995㎡)
- 규 모: 스마트팜 온실 1,656㎡(폭8\*2연동\*측고4.5\*길이92m)

면 적	재배배드	온실사양
재배실 1,344㎡, 관리실 128㎡, 방풍벽 184㎡	스티로폼 10라인 (높이 50~60cm, 드리퍼 20cm 간격)	렉피니언 천창, 2중 측창, 내측 다겹커튼, 상부 2중 스크린 등

※ 조 성: 2021년 359백만 원(국비 150, 도비 45, 군비 164)

○ (창업지원) 스마트팜 시설 구축지원 → 임차종료 후 자립 유도

- 사 업 비: 400백만 원 [도비 80, 군비 200, 자부담 120(농협 20 포함)]
- 지원내용: 내재해형 시설하우스, 재배설비, 스마트팜시스템 등

※ 도비지원 『청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원』 사업 공모

□ 세부계획

○ (경영실습) 청년 스마트팜 임대농장 운영 및 컨설팅

임대기간	임차인	'23년 임대료	재배작물
2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	박은찬(구례읍, 男, '88年生)	290,000원	오이(양액)

※ 컨 설 팅: 연간 20회 이상

○ (창업지원) 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원

- 사업기간: 2024. 3. ~ 12.

※ 임차종료(2024. 12. 31.) 직 후 스마트팜 자립영농 시작

- 사업대상: 스마트팜 경영실습 임대농장 운영 청년농업인

※ 대상 청년 사업필지 기 확보(문척면 월전리 1267-2, 3,000㎡)

- 사업규모: 스마트팜 온실 3연동 0.26ha 내외

- 사업비: 400백만 원 [도비 80, 군비 200, 자부담 120(농협 20 포함)]

- 사업내용: 내재해형 시설하우스, 재배설비, 스마트팜시스템 등

구분	계	내재해형 시설하우스 (골격+피복+유동·환기팬)	재배설비 (베드+ 양액·관수+난방 등)	스마트팜 시스템	기타 (설계, 기반 등)
소요예산 (백만 원)	400	270	85	25	20

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	1,059	359	-	-	400	-	-	300	759	359	-	-	400	-	-
국비	150	150	-	-	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-
도비	215	45	-	-	80	-	-	90	125	45	-	-	80	-	-
군비	499	164	-	-	200	-	-	135	364	164	-	-	200	-	-
기타	195	-	-	-	120	-	-	75	120	-	-	-	120	-	-

□ **지금까지 추진사항**

- 청년농업인 스마트팜 임대농장 조성: 1개소('21년 359백만 원)
- 스마트팜 창업 의향 청년농업인 임대: 1명('22. 1. 1.~'24. 12. 31.)
- 1기 임차 청년 오이(양액) 6차 작기(9. 3. ~ 11월 하순) 재배 중

□ **향후계획**

- 청년농업인 스마트팜 임대농장 지속 운영

1기	2기	3기	4기
2022년 ~ 2024년	2025년 ~ 2027년	2028년 ~ 2030년	2031년 ~ 2033년

- 임대농장 수료 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원

1기	2기	3기	4기
2024년	2027년	2030년	2033년

사업부서

농업기술센터소장 박근규 원예작물팀장 이승철(8061) 담당자 주성찬(8063)

## 청년농업인 스마트팜 경영실습 임대농장 현황사진



## 2024년 청년농업인 스마트팜 자립기반 구축 지원사업 예정지



**P8-41**

**지리산 치유농업 캠퍼스 조성**

- 지리산 등 천혜의 자연자원과 농업자원을 활용한 치유농업 캠퍼스 조성, 치유관광상품 개발 지역경제 활성화에 기여
- 농업활동+휴양+여가+관광이 복합된 새로운 치유농·산업 창출

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 □ 임기 외 ■	<b>국 가</b> □ 전남도 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	300(억 원)	<b>사업주체</b> 구례군 ■ 기 타 □
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 □    일부추진 ■	<b>추진율</b>	15%	<b>추진부서</b> 농업기술센터

□ **사업개요**

- 기 간: 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 장 소: 구례군 용방면 용정리 산 22-1, 산 58-1 번지 일원
- 사 업 비: 300억 원(국비 144.5 지방비 155.5) ※ 기투자 11억 원(군비)
- 내 용: 농업활동·휴가·여가·관광 결합 복합치유농업단지 조성

구 분	계	용정리 산 22-1	용정리 산 58-1
부지면적	858,644㎡	216,793㎡	641,851㎡
가용율	-	33,000㎡	60,000㎡
조성면적	82,500㎡	22,500㎡(부지면적 10.3%)	60,000㎡(부지면적9%)
세부계획	구 성	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 팜빌리지: 개인텃밭, 동물농장</li> <li>· 클라인가르텐: 장단기채류형 숙박</li> <li>· 치유복합센터: 편의시설 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 치유의 숲:</li> <li>- 편백, 고로쇠 등 조림</li> </ul>
비 고	-	계획관리지역, 농림지역	농림지역,보전관리지역

## □ 예산계획

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026	2027
계	30,000	-	1,000	50	-	2,100	13,400	13,450	1,100	-	1,000	100	-	-	-	-
국비	14,450	-	-	-	-	1,050	6,700	6,700	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	15,500		1,000	50	-	1,050	6,700	6,750	1,100	-	1,000	100	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진사항

- 2022. 12. : 조성 부지 매입(용방면 용정리 산 58-1번지, 641,851㎡)
- 2023. 2. : 조성 부지 확장(군유지: 용정리 산 22-1번지, 216,793㎡)
- 2023. 5. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 수립  
(용역기관: 문화디자인, 용역비: 50백만 원(군비))
- 2023. 6. : 기획재정부 「생활인구 확충 사업」 공모 (미선정)
- 2023. 6. : 전라남도 「전남형 균형발전 300프로젝트」 신청 (미선정)
- 2023. 7. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 착수보고회
- 2023. 9. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 중간보고회
- 2023. 10. : 치유농업활성화 네덜란드·벨기에 업무협약(MOU) 체결


## □ 향후계획

- 2023. 12. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 완료
- 2024. 1. ~ 10. : 중앙투자심사 등 사전행정절차
- 2025. ~ 26. : 설계 공모 및 기본·실시설계 추진
- 2027. : 공사 착공 및 준공

## □ 문제점 및 대책

- 소관부서(농촌진흥청) 국고현안사업 재정 반영 불가
  - ⇒ 농촌진흥청 치유농업 관련 예산 편성규모가 10억 원 이내로, 대규모사업 추진 불가 의견 통보
- 기획재정부 「생활인구 확충 사업」 공모, 전라남도 「전남형 균형발전 300프로젝트」 신청 등 국비사업 예산 신청하였으나 미반영
  - ⇒ 국비·산림청·기재부등 중앙부처 예산 반영 적극 활동 추진하고, 예산 확보여부에 따라 사업 추진

# 위치도

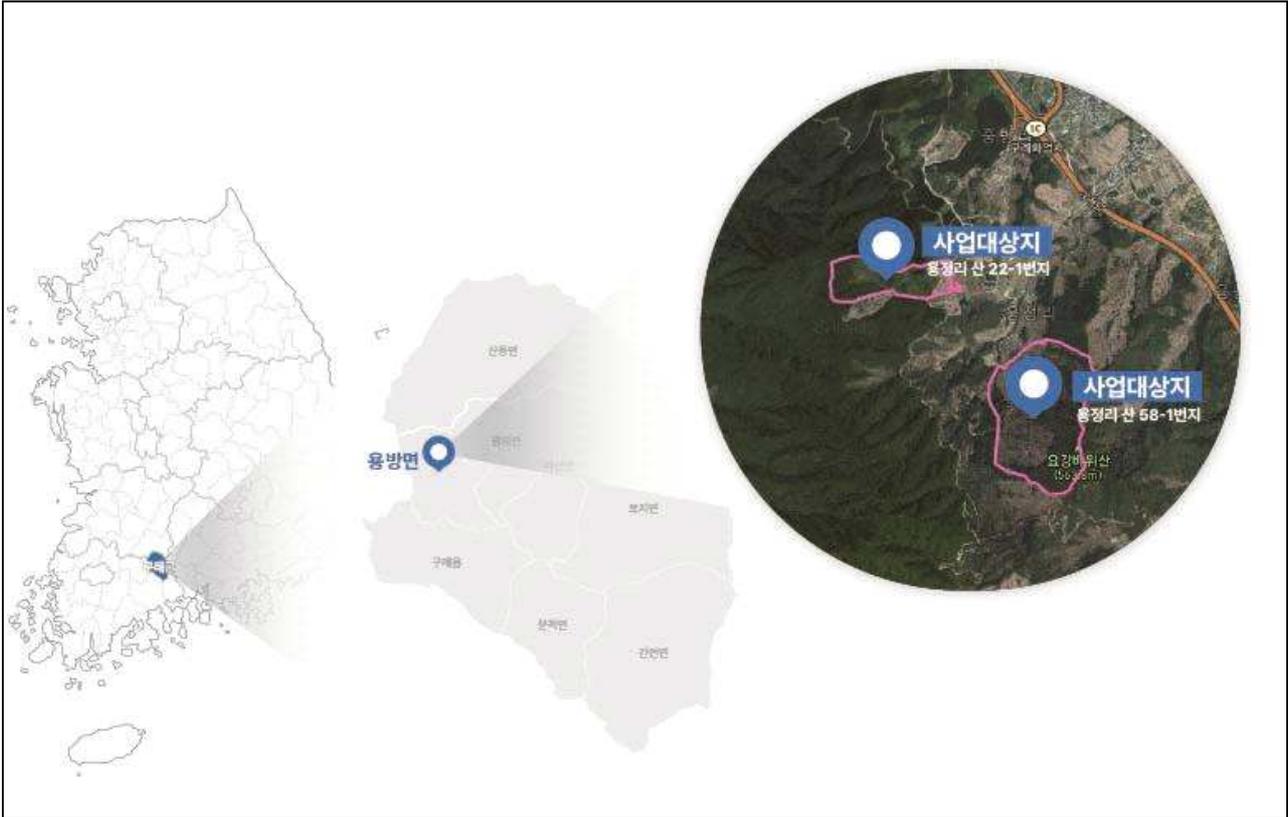

# 현황사진



- 안정적인 농작물을 재배하고 토양환경 개선을 위한 교육, 홍보, 시범사업 등을 통한 지속 가능한 농업 구현
- 기후환경 위기 대응 탄소 저장고 역할을 하는 흙의 가치와 중요성을 알리고 범국민적 인식 개선과 함께 실천 방안 모색

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	10.5(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 60%	<b>추진부서</b>	농업기술센터

□ 사업개요

○ 흙 살리기 사업 추진

- 기 간: 2023. ~ 2026.
- 사 업 비: 200백만 원(군비)/ 2023년 사업비
- 내 용
  - 흙 살리기 인식 개선 교육 · 선포식 · 토론회 추진
  - 구례밀 짜장면 페스티벌, 흙 살리기 역량강화 워크숍 개최
  - 흙 살리기 중장기 발전 계획 수립
  - 지력증진 토양 살리기 실천과제 발굴 및 추진
  - 농경지 토양검정을 통한 토양 분석 및 시비 처방

○ 탄소중립 흙 살리기 박람회 개최

- 기 간: 2024. 10월(예정)
- 장 소: 구례공설운동장 일원
- 사 업 비: 800백만 원(도비 350, 군비 450)
- 내 용: 탄소중립 실천 학술행사, 전시, 체험 프로그램 운영 등

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	1,050			200	850				1,050			200	850		
국비															
도비	350				350				350				350		
군비	700			200	500				700			200	500		
기타															

## □ 지금까지 추진사항

○ 흙 살리기 TF팀 신설: 1팀 3명

○ 탄소중립 흙 살리기 협약식 개최

- 일 시: 2023. 2. 28.(금) 13:00

- 협약기관: 4개 기관(구례군+M이코노미뉴스+국제녹색휴머니티기구+류재춘 화가)

- 협약내용: 탄소중립 흙 살리기를 위한 홍보활동 및 정보공유 등

○ 농업인 대상 흙 살리기 교육 추진

- 일 시: 2023. 3. 28.(화) 14:00

- 주 제: 생명을 살리는 흙의 소중함과 미래의 농업 방향

○ 흙 살리기 선포식 개최

- 일 시: 2023. 4. 7.(금) 13:30

- 인 원: 1,000명(국회의원, 군의원, 농업인 등)

- 내 용: 선포식, 퍼포먼스 및 선언문 낭독 등

○ 탄소중립 흙 살리기 국회 토론회 개최

- 일 시: 2023. 6. 22.(목) 14:00

- 장 소: 국회도서관 대강당

- 참석인원: 200명(국회의원, 관계부처, 공무원, 군민 등)

- 내 용: 탄소중립, 흙 살리기 실천방안 토론

○ 구례밀 짜장면 페스티벌 개최

- 기 간: 2023. 10. 13.(금) ~ 14.(토) / 2일간

- 장 소: 서시천체육공원 일원
- 참석인원: 2,000명(관계부처 기관장, 흙 살리기 관계자, 군민, 관람객 등)
- 내 용: 개막식, 흙 살리기와 구레밀 홍보·시식·체험·판매

### ○ 탄소중립 흙 살리기 역량강화 워크숍

- 기 간: 2023. 10. 13.(금) ~ 14.(토) / 1박 2일
- 장 소: The-K 지리산가족호텔
- 참석인원: 80명(전국 흙 살리기 관계자 및 회원 75, 내빈 5)
- 내 용: 개회식, 특강, 흙 살리기 방안마련 정보 공유 등

## □ 향후계획

### ○ 흙 살리기 사업 추진

- 다시마 액비 이용 시설원예 흙 살리기 실증사업
- 탄소중립 흙 살리기 중장기 발전 계획 수립 연구용역
- 종합검정실 운영 토양검정 시비처방

### ○ 탄소중립 흙 살리기 박람회 개최

- 제4차 지방재정 투자심사 확정: 2023. 10.
- 추진단 구성 및 대행사 선정: 2024. 1. ~ 3.
- 행사 준비 및 홍보: 2024. 3. ~ 10.
- 흙 살리기 박람회 개최: 2024. 10.(예정)

# 보 건 의 료 원

**【P8-46】** 어르신 병원 진료비 지원

**【P8-54】** 구례군 출산가정 산후관리비 지원

**【P8-09】** 가족형 요양타운 조성 (장기계획)

관내 주민등록을 둔 65세 이상 고령층을 대상으로 공공보건의료기관 진료비 본인부담금 면제

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	없음		
<b>추진상황</b>	완료 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 100%	<b>추진부서</b>	보건의료원

□ 추진배경

- 구례군 65세 이상 인구 비율: 전체 인구의 36.9%( '23. 1월 기준)
- 초 고령 사회 진입에 따른 노인복지 정책 추진 필요성 증대
- 진료비 감면을 통해 지역 어르신의 만성질환 예방 관리
- 건강한 노후를 위한 보건의료원의 공적 책임 강화 및 양질의 의료서비스를 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 10. 4 ~ 계속사업
- 사업기관: 보건의료원, 보건지소, 보건진료소
- 사 업 비: 없음
- 사업내용: 관내 65세 이상 어르신의 진료비 본인부담금 면제 추진

(단, 비 급여 본인부담금은 감면 제외)

※ 추진근거 : 구례군 보건의료기관 운영에 관한 조례 제6조(진료비 및 수수료 감면) 적용

## □ 지금까지 추진사항

- 2023. 3월 보건복지부 사회보장위원회 협의 의뢰
- 2023. 3월 민선8기 군수 공약사항 어르신 병원 진료비 지원 결재
- 2023. 9월 보건복지부 사회보장조정과-6065(2023.9.4.)호에 의한 협의완료
- 2023.9.13.민선8기 군수 공약사항 어르신 병원 진료비 지원 실시 결재
- 진료비 면제 지원 실적(2023. 10월 기준): 1,397,200원 / 439명  
- 10월 총 진료환자 수(698명) 대비 63%(439명)가 지원을 받음

☞ 공약취지에 맞게 사업목적을 달성하였으므로 공약이행도 '완료' 로 변경

## □ 기대효과

- 공공의료 서비스 확대로 건강취약계층(노년층)의 의료 접근성 강화
- 의료비 지원을 통한 의료사각지대 해소 및 지역의료 안전망 확대
- 구례군 인구유입 유도 및 주민 건강증진 도모

사업부서

보건의료원장 김형진    진료팀장 임영란(2031)    담당자 문미경(2041)

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	1.6(억 원)	<b>추진부서</b>	보건의료원
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 □    일부추진 ■	<b>추진율</b>	50%		

□ 사업개요

- 기 간: 2025년 1월 ~
- 장 소: 구례군 보건의료원
- 사업비: 160백만 원(군비 100%)
- 대 상: 관내 3개월 이상 주민등록을 두고 거주하여 출생 신고한 산모
- 내 용: 산후관리 비용지원
  - 출산자 산후관리비 지원 (1인 / 1백만 원)
  - 산출근거: 1백만 원 × 160명 (예상 인원: 80명 × 2년)

□ 지금까지 추진사항

- 2023. 6.: 구례군 출산가정 산후관리비 현금 지원 가능여부 유선 질의 (사회보장조정과 유선 답변): 단순 현금성 지원 정책은 협의 어려움.  
※사회보장위원회 신설변경 협의제도: 사회보장기본법 제26조
- 2023. 7.: 구례군 출산가정 산후관리비 지원 신설·변경 협의 요청
- 2023. 10. 26.: 보건복지부 사회보장조정과 진행상황 유선 질의 (사회보장조정과 유선 답변): 5월 협의건 답변 중으로 빠른 시일 내에 답변 노력하겠습니다

□ 향후계획

- 사회보장제도위원회 답변 결과 확인 후 다른 방향의 서비스 지원책 방안 강구

사업부서

보건의료원장 김형진    증진팀장 박광임(2017)    담당자 이혜영(2025)

# 주 민 복 지 과

**【P8-47】 구례형WHO 고령친화도시 조성**

**【P8-48】 어르신 생활을 돕는 마을 활동가**

- WHO 고령친화도시 네트워크 가입 · 인증
- 초고령 사회 능동적 · 체계적 대응

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기 추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	0.8(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	30%	<b>추진부서</b>	주민복지과

□ 사업개요

- 기 간: 2022. ~ 2026.
- 장 소: 구례군 관내 일원
- 사업비: 0.8억원
- 내 용: WHO 고령친화도시 조성
  - 구례군 고령친화 환경 분석 및 진단
  - 고령친화도시 조성 종합 중·장기 실행계획 수립 및 정책 제안
  - 고령친화도시 조성의 추진체계 및 모니터링, 평가체계 구축
  - WHO 고령친화도시 국제 네트워크 가입

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계															
국비															
도비															
군비	80			50	10	10	10		60			50	10		
기타															

□ **지금까지 추진사항**

- 2023. 6. 30.: 구례군 고령친화도시 조성에 관한 조례 공포
- 2023. 7. 18.: 구례군 고령친화도시 연구용역 시행
- 2023. 8. 2.: 구례군 고령친화도시 연구용역 착수보고회 개최
- 2023. 9. 6.: 구례군 고령친화도시 조성 관련 FGI 조사 실시

□ **향후계획**

- 2023. 10. ~ 12.: 고령친화도시 중간·최종 보고회 개최
- 2023. 12. ~ 2024. 1.: WHO 고령친화도시 가입신청서 제출 및 인증

어르신 생활을 돕는 마을활동가를 배치하여 취약계층에 정책안내와 행정도움을 주어 지역공동체를 활성화하고 공동체 네트워크를 구축하여 마을 복지를 증진

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>전남도</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	3.1(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	90%	<b>추진부서</b> 주민복지과

□ 사업개요

- 기 간: 연중
- 활동인원: 17명(구례읍 3명, 7개면 각 2명 배치)
- 사 업 비: 310,000천 원(군비 100%)
- 내 용:
  - 행정경험이 있는 퇴직자 등의 재능을 활용한 마을 봉사 성격의 활동
  - 복지 교육을 지속적으로 실시하여, 도움이 필요한 어르신들에게 관련 정책을 홍보하고, 서비스 신청까지 해주는 행정연계 제공
  - 지역민과의 화합 및 소통으로 지역복지 활성화 및 마을복지를 향상을 위한 정책 제안 등

□ 예산계획

- 어르신 생활을 돕는 마을 활동가 활동비 및 용품구입비 62,050천원 확보  
(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계															
국비															
도비															
군비	310			62	62	62	62	62	62			62	62		
기타															

○ 산출기초

- 인 건 비: 17명 × 12개월 × 300천원 = 61,200천원
- 부대비용: 17명 × 50,000원(조끼, 모자 등) = 850천원

□ **지금까지 추진사항**

○ 2023. 1. 의원간담회 실시

- 조례 추진 과정 중 의원 간담회 실시
- 조례개정을 의원 발의로 하기로 결정

○ 2023. 5. 제6회 조례규칙심의 부의 안을 통해 6월 조례 공포

- 구례군 노인복지 증진 및 장수노인 우대에 관한 조례 일부개정

○ 2023. 10. 마을활동가 추진계획 수립 및 마을활동가 모집

□ **향후계획**

○ 2023. 11. 마을활동가 간담회 실시

○ 2023. 11.~12. 마을활동가 안전·직무 교육 및 사업 운영

# 평 생 교 육 과

**【P8-08】 구례농촌유학센터 조성**

**【P8-49】 평생학습도시 지정기반 구축(완료)**

**【P8-50】 도시와 농촌 간 중·고등학생 학력격차 해소(완료)**

**【P8-51】 군민 리스타트(Restart) 평생 직업교육 확대(완료)**

**【P8-52】 초중고 학생 통학요금 지원(완료)**

**【P8-25】 청소년을 위한 청춘문화공간 조성(청소년 축제)**

농촌유학생 유치로 농촌의 작은 학교 폐교위기를 극복하여 지역공동체 소멸을 방지에 기여하고 인구감소위기에 적극적으로 대응코자 함.

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 전 남 구 기 □ 전 남 구 기 ■ 도 군 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	37.9(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □ 정상추진 ■	완료 후 계속 □ 일부추진 □	<b>추진율</b> 5%	<b>추진부서</b>	평생교육과

**추진방향**

- 유학가정이 거주할 주거시설 부족으로 농촌유학센터 건립 필요성 증가
- 도시 학생과 농촌학생이 사회적 문화적 교육적으로 공감하는 공간 조성
- 작은 학교 살리기와 연계하여 지방소멸위기 적극 대응

**사업개요**

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 사업장소: 전남 구례군 구례읍 계산리 473(舊 계산분교)
- 사 업 비: 3,794백만 원(광역기금 1,194, 기초기금 2,600)\*

**※ 지방소멸대응기금 사업으로 추진**

- 사업규모: 주택 20채 내외, 커뮤니티센터 1동 등
- 사업내용
  - 농촌유학타운 기본 및 실시설계, 사전행정절차(계약심사, 건축인허가) 등: 23. 11. ~ 24. 5.
  - 농촌유학타운 착공: 2024. 6월
  - 농촌유학타운 주거시설 조성: 2024. 11월 준공
  - 농촌유학타운 홍보 및 유학생 유치: 2024. 11. ~ 12월
  - ‘농촌홀리데이 프로그램’ 기획 운영
    - 구례의 ‘색깔’ 을 만끽할 수 있는 지역특성에 맞는 유학프로그램 운영
      - ※ 구례생태기행, 역사체험, 사찰투어, 관광명소 체험, 우리밀 빵체험, 정원투어 등
    - 도시에서 유입된 다수의 유학생가정이 지역주민과 함께 공유하며 적용할 수 있도록 다양한 체험교육 운영
      - ※ 숲체험, 목공체험, 농장체험, 공동생활교육, 부모자녀체험담 공유의 장 마련 등

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,794			180	3,614				3,794			3,794			
국비	2,600				2,600				2,600			2,600			
도비	1,194			180	1,014				1,194			1,194			
군비															
기타															

## □ 지금까지 추진상황

- 2023. 4.: 건축기획용역 완료
- 2023. 8.: 공공건축심의위원회 조건부 의결(보행로, 경사로, 특화공간 등)

## □ 문제점 및 대책

- 해당없음

## □ 향후계획

- 2023. 9. ~ 10.: 설계공모 추진
  - ※ 설계비용 약 160백만 원(디자인·경관·B/F예비인증 등)
- 2023. 11. ~ 2024. 4.: 기본 및 실시설계
- 2024. 5.: 사전행정절차 추진(계약심사, 건축인허가 등)
- 2024. 6.: 농촌유학타운 착공
- 2024. 11. ~ 12.: 농촌유학타운 준공 및 유학생 유치 등

사업부서

평생교육과장 이해원    평생교육팀장 황혜경(2625)    담당자 김동곤(2628)

지역평생학습체제 구축으로 맞춤형 특화프로그램 운영 및 인프라 강화로 평생학습 기회 확대 및 주민 개개인의 삶의 질 향상

<b>사업구분</b>	신규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	2.8(억 원)	<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>
<b>추진상황</b>	<b>추진율</b> 100%		<b>추진부서</b>	평생교육과	

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 지속추진
- 사업대상: 관내 주민
- 사업비: 2,800백만 원(기초기금 2,000 국비 90, 군비 710)  
※ 지방소멸대응기금 등 사업으로 추진

○ 사업내용

1) 평생학습관 조성(구 매천도서관 리모델링)

- 사업기간: 2022. 9. ~ 2023. 12.
- 위치: 구 매천도서관(구례읍 봉북리 39)
- 사업비: 2,000백만 원(군비, 지방소멸대응기금)
- 사업내용: 건축면적 338㎡, 연면적 700㎡
  - 1층: 강의/교육실, 휴게실(소통공간), 학습실, 사무실, 장애인화장실 등
  - 2층: 강의/교육실, 크리에이티브실(3개소), 공유오피스, 평생교육실 등

2) 평생학습 프로그램 운영

- 성인문해교실 운영: 23. 10. ~ 12.(마을별 비문해 성인 대상 추진)  
※ 운영마을: 5개소(야동, 토금, 냉천, 원촌, 원좌)
- 읍면 평생학습센터 지정 및 운영: 2023. 7. ~ 12(8개소, 읍면당 1개소씩)
- 평생학습 마을학교 운영: 2023. 7. ~ 12.(총 32개 소)
  - 1차 운영(17개소): 냉천, 수내, 흥대, 오봉, 온동, 삼성, 정산, 양정, 구만내죽, 구성, 수내, 월평, 하사, 봉동3구, 광평, 감천
  - 2차 운영(15개소): 동산, 백련, 봉북, 용전, 방광, 지상, 당촌, 죽연, 전천, 대촌, 야동, 사림, 하죽, 남산, 평도
- 4차 산업혁명 대비 정보화교육: 2종(e-커머스, 영상편집프로그램 등)

- 취업과 연계한 직업교육 인프라 마련 및 교육실시: 2023. 11.~ 12월  
 ※ 3종(마을교육 코디네이터, 드론, 시니어 바리스타) 교육 추진
- 지역특화, 생태, 역사 등 구례형 평생학습 추진: 2023. 10 ~ 12월  
 ※ ‘길따라 물따라 섬진강 생태교육’ 기행: 관내교육 4회, 관외방문 4회
- 평생학습동아리 운영: 23. 9. ~ 23. 12월(7개 동아리)  
 ※ 클래식(GA양상블), 색스폰(G-어울링), 장고(이랑고고), 캘리그라피(우리는 요술쟁이)  
 우크렐레(섬지우쿨), 그림책 만들기(구례 그림이다), 환경생태(산따라)

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	2,800			300	2,100	200	200		2,200			2,276			
국비	2,090			190	1,900				2,090			2,090			
도비												6			
군비	710			110	200	200	200		110			133			
기타												47			

※ 2027년 이후 지속추진 예정

## □ 지금까지 추진상황

### ○ 평생학습관 조성

- 2022. 10. ~ 12.: 건축기획용역 추진
- 2023. 6. ~ 9.: 기본 및 실시설계 추진  
 ※ 기본 및 실시설계 용역비: 80백만 원(150일 간)
- 2023. 11.: 전라남도 계약심사
- 2023. 12.: 평생 학습관 공사(리모델링) 착공

## ○ 평생학습도시 조성사업

- 2023. 3.: 평생학습도시 선정(23. 3. 7.)
- 2023. 7: 읍면 평생학습센터(8개소) 운영, 평생학습네트워크 개최(1회차: 청년대표)
- 2023. 8: 평생학습동아리 추진(7개 동아리)  
전남형생태학습도시조성사업 추진(에코캠페인, 부모·자녀교육 등)
- 2023. 9: 평생학습 네트워크 추진(2회차: 마을학교, 평생학습센터, 동아리대표 등)
- 2023. 10: 정보화교육, 섬진강 생태교육기행 등 수강생 모집

## □ 향후계획

### ○ 평생학습관 조성

- 2023. 11월말: 평생학습관 실시설계 완료
- 2023. 12월초: 전라남도계약심사, 일상감사 등 행정절차 추진
- 2024. 1.: 평생학습관(리모델링) 착공
- 2024. 6.: 평생학습관 준공
- 2024. 7.: 평생학습관 프로그램 운영

### ○ 평생학습 프로그램 운영

- 2023. 11.: 대한민국 평생학습박람회 체험부스 운영(23. 11. 2.~11. 4.)
- 2023. 11: 마을교육코디네이터 및 시니어 직업교육 운영(23.11~12월)
- 2023. 11.: 에코리더 양성교육 추진(23. 11.~ 12월)
- 2023. 11: 4차 산업혁명 대비 정보화교육(23. 11~12월)
- 2023. 12.: 구례군 평생학습 축제 개최 등(23. 12. 9. 예정)

사업부서

평생교육과장 이해원    평생교육팀장 황혜경(2625)    담당자 김동곤(2628)

지역적, 공간적 제한이 없는 유명 강사 온라인 교육지원을 통해 대도시와의 교육 격차를 해소하고 지역 인재를 양성하고자 함

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ <b>사업주체</b> 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	0.8(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 ■ 정상추진 □ 일부추진 □	<b>추진율</b>	100%	<b>추진부서</b> 평생교육과

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 대 상: 444명(중 246명, 고 198명)
- 사업비: 80백만 원(인재육성기금, 연간 20백만 원/4개년)
- 내 용: 인터넷 수능방송(강남인강) 수강료 지원
- ※ 구례군⇄강남구청 협약 체결(2023. 1. 27)

□ 예산계획

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	80			20	20	20	20		20			20			
국비															
도비															
군비	80			20	20	20	20		20			20			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 중·고등학교 업무 관계자 회의 개최: 2023. 2. 20.
- 학교별 수강대상자 추천 및 수강권 교부(141명)
  - 1차 신청: 3. 6. ~ 3. 24.(136명) / 4. 12. 수강권 배부
  - 2차 신청: 4. 10. ~ 4. 21.(5명) / 5. 10. 수강권 배부
  - 3차 신청: 5. 12. ~ 5. 19.(0명)
- 1차 모니터링(수강권 등록여부 확인 및 독려) 실시: 10 ~ 12월

## □ 향후계획

- 학교별로 수강대상자 상시 추천 및 수강독려: 10 ~ 12월 중
- 2차 모니터링(진도율 및 만족도 조사) 실시: 10 ~ 12월 중

관내 청소년 청년 등의 취업률 상승으로 지역 성장동력을 확보하고 지역산업과 연계한 직업교육 실시로 인구유출 방지 및 인구유입 기대

<b>사업구분</b> 신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b> 임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b> 국 ■ 도 ■ 시 ■ 군 ■ 자치 ■ 단체 ■ 기타 □
<b>예산구분</b> 예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b> 1.4(억 원)	
<b>추진상황</b> 완료 □ 정상추진 ■	완료 후 계속 □ 일부추진 ■	<b>추진율</b> 100%
		<b>추진부서</b> 평생교육과

□ 사업개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ (지속추진)
- 사업대상: 관내 주민(은퇴자, 청년 등)
- 사업비: 약 140백만 원(군비)
  - 2023.: 20백만 원(국비 9, 군비 11)
  - 2024. ~ 2026.: 매년 40백만 원(군비 확보)
- ※ 평생학습도시 지정 이후 4년 뒤 재지정평가를 위해 사업비 확보 필수
- 추진방법: 주민 수요조사 후 위탁공고 등을 통한 사업 추진
- 사업내용: 대학교 교육지원청과 연계한 직업프로그램 운영

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	140		-	20	40	40	40		20			20			
국비			-												
도비			-												
군비	140			20	40	40	40		20			20			
기타															

※ 2027년 이후 지속추진 예정

## □ 지금까지 추진사항

### ○ 군민 리스타트 직업교육 추진(대학 및 교육기관 연계 추진)

- 2022. 9.: 순천대연계 온라인 평생학습 추진(전통문화해설사 등 4개 과정)
- 2022. 10.: 평생학습 활성화를 위한 업무협약(순천제일대)
- 2023. 6.: 은퇴자, 시니어 직업교육 추진을 위한 업무협약(순천청암대)
- 2023. 7.: 직업교육 개선을 위한 6개 과정 수요조사 완료(군 소통마루, 기관단체 및 읍면 등)  
※ 수요조사 결과 자격증과정 이동놀이지도사, 방과후 돌봄, 바리스타 등, 드론, 로컬 크리에이티브 순으로 선호함  
⇒ 방과후돌봄지도사' 교육: 15명(23. 6 ~ 7월), '캘리그래피 지도사' 과정: 20명(23. 6 ~ 7월)
- 2023. 9.: '글로벌대학 30' 선정에 따른 업무협약 체결(순천대)
  - 협약기관: 구례군 ⇔ 순천대(2023. 9. 15.)
  - 협약내용: 치유힬링산업, 주민수요반영(평생학습 개설, 자격증과정), 직장인 교육 등
- 2023. 10.: 마을교육코디네이터, 시니어 바리스타 양성과정 위탁공고

## □ 향후계획

### ○ 2023. 10. ~ 11.: 민간자격 취득과정운영(에코리더, ai 드론 등)

- 에코리더 양성 교육: 20명
- 마을교육코디네이터 양성 교육: 15명
- 시니어 바리스타 양성 교육: 20명
- 문해교실 강사양성 교육: 20명

### ○ 2023. 12.: 평생학습 지속추진을 위한 업무협약(대학, 교육기관 등)

사업부서

평생교육과장 이해원    평생교육팀장 황혜경(2625)    담당자 김동곤(2628)

농촌지역 학교 통학 환경을 개선하여 학생들의 교통 불편 해소 및 통학 기본권을 보장하고자 함

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	0.4(억 원)	<b>추진상황</b>	<b>추진부서</b> 평생교육과
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 100%		

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2026. 12.
- 대 상: 1,647명(초 803, 중 468, 고 376)
- 사업비: 40백만 원(군 인재육성기금)
- 내 용:
  - 초·중학생은 기존 도 교육청인재육성기금으로 에듀버스·택시 지원중임
  - 고등학생은 인재육성기금 지원을 통한 에듀택시 지원사업 확대

□ 예산계획

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	40			10	10	10	10		10			10			
국비															
도비															
군비	40			10	10	10	10		10			10			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 중학생은 기존 인재육성기금 에듀택시 사업비 지원: 22,347천 원
- 고등학교 업무관계자 사전간담회 실시: 2. 20.
- 인재육성기금 운영계획 변경 심의 의결: 4. 26.
- 고등학교 에듀택시 사업비(인재육성기금) 지원: 5. 31. 10백만 원
- 에듀택시 탑승 대상자 통학 운영 및 지원 관리
  - 구례고등학교: 택시 2대(6.14.계약 및 6.19.운영)
  - 자연과학고등학교: 택시 2대(7.4.계약 및 7.10.운영)

## □ 향후계획

- 에듀택시 탑승 대상자 통학 운영 및 지원 관리: 10 ~ 12월 중
- 에듀택시 사업 정산 및 만족도 조사: 12월 중

# 종 합 민 원 과

**【P8-53】 공동주택 시설 개선 지원 확대**

**P8-53**

**공동주택 시설 개선 지원 확대(완료)**

하자담보기간(준공 후 10년)이 만료된 20세대이상 공동주택단지에 시설유지관리비를 지원하여 입주민 거주욕구와 주거환경 개선 도모

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	4.4(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	100%	<b>추진부서</b> 기획예산실

**□ 사업개요**

- 기 간: 연중실시
- 장 소: 11개소(준공 후 10년이 경과된 20세대이상 공동주택)
- 사업비: 440백만원(30백만원/개소)
- 내 용:
  - 도로, 인도, 상하수도, 휴게시설 등 단지 내 시설정비
  - 긴급을 요하는 각종 재해예방 및 복구시설
  - 주민 안전을 위한 CCTV 설치 및 보수

**□ 예산계획**

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	440	160	40	60	60	60	60		260	160	40	60	-	-	-
국비															
도비															
군비	440	160	40	60	60	60	60		260	160	40	60	-	-	-
기타															

## □ 지금까지 추진사항

연번	명칭	위치	세대수	준공	경과	지원현황	지원액(천원)	지원내역
	계	11단지	908			8단지	236,000	
1	삼우아파트	구례읍 봉동리 531-1	78	1993	28년	2014년	20,000	아스콘재포장 가로등교체 등
						2022년	20,000	담장철거 및 주차장확포장
2	자리산파크	구례읍 봉북리 458-6	180	2000	21년	2015년	20,000	CCTV 및 어린이놀이대설치
						2023년	20,000	정화조 철거
3	장안연립	구례읍 봉동리 104-8	48	1983	38년	2016년	15,000	배수관로 및 포장공사 등
						2023년	16,000	지하집수정설치
4	진산연립(가)	구례읍 봉북리 409-2	39	1989	32년	2017년	20,000	옥상지붕설치
						2022년	20,000	외벽 도색
5	한광아파트	구례읍 봉북리 50-2	64	1990	31년	2018년	20,000	주차장아스콘포장 급수관교체, 보호통설치
6	봉성연립	구례읍 봉남리 71-2	30	1985	36년	2019년	5,000	CCTV설치
7	명지아파트	구례읍 백련리 575	296	1997	24년	2013년	20,000	CCTV교체
						2020년	20,000	상수도펌프교체
8	리치빌라	마산면 냉천리 61-3	22	2011	10년	2021년	20,000	외벽 도색
9	진산연립(나)	구례읍 봉남리 90	24	1987	34년	-	-	
10	삼익아파트	산동면 원촌리 277-1	44	1999	22년	-	-	
11	섬지뜰아파트	구례읍 봉북리 143-1	83	2011	10년	-	-	

- 사업 공고 및 신청서 접수 : 2023. 2. ~ 3.
- 공동주택지원 심의위원회 개최 : 2023. 3. ~ 4.
- 사업 대상지 선정 및 보조금 교부 신청: 2023. 4. ~ 5.
- 보조금 교부 결정 및 사업 시행 : 2023. 5. ~ 6.
- 사업 완료 : 2023. 6.

사업부서

종합민원과장 김장수 주택팀장 정영훈(2472) 담당자 고주현(2473)

# 스 포 츠 산 업 과

**【P8-26】 전남도민체전 유치**

**【P8-34】 구례 웰니스 복합센터 조성**

**【P8-55】 취약계층을 위한 체육시설 조성**

- 임기 내 전라남도체육대회 개최를 목표로 추진
  - 제65회 전라남도 체육대회 유치(2026년 개최)

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 ■
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	37억 원		
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □	<b>추진율</b>	20%	<b>추진부서</b>	스포츠산업과

□ 추진방향

- 자연과 호흡하는 치유와 힐링의 관광 스포츠 융복합 체전
- 국립공원 제1호 지리산, 큰 산 아래 전남인 하나로 화합 체전
- 2백만 도민이 하나 되는 생명의 땅 전남, 청정구례 으뜸 체전

□ 사업개요

- 대 회 명: 제65회 전라남도 체육대회
- 사업기간: 2026. 4월 중(4일간)
- 사 업 비: 37억 원
- 참가규모: 22개 시군 15,000명
- 경기종목: 22개 종목
- 주 최: 전라남도 체육회
- 전남도민체전 연관 대회 일정

구분	시기	규모	비고(경제효과)
전라남도장애인체육대회	당해 4월중(3일간)	2,000명	51억 원
전라남도 장애인생활체육대회	다음해 9월중(2일간)	2,000명	34억 원
전라남도어르신생활체육대축전	다음해 6월중(2일간)	2,000명	34억 원
전라남도어린이생활체육대축전	다음해 8월중(1일간)	800명	68백만 원
전라남도 생활체육대축전	다음해 10월중(3일간)	7,000명	17억 85백만 원
기타(프레대회)	전년 대회당 (2일간)	10,000명	10개 대회 17억 원

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,700			800	500	2,400	-	-	800			-	-	-	
국비	-			-	-	-	-	-	-			-	-	-	
도비	400					400			-			-	-	-	
군비	33,00			800	500	2,000	-	-	800			800	-	-	
기타															

## □ 지금까지 추진 실적

- 제63회 전남도민체전 유치 신청 : 영광군 선정
- 재64회 전남도민체전 유치 추진 기본계획 수립 : 2022. 8.
- 대회 경기장 전수조사 개보수계획 수립 : 2022. 9.
- 제64회 전남도민체전 유치 신청 : 2022. 10. 31.
- 제64회 전남도민체전 개최지 결정 : 2023. 5. 31.(장성군)

## □ 문제점 및 대책

- 개최지 선정 관련 규정에 따라 미개최지 및 오래된 시군 우선권 부여
  - 개최지 결정기준 변경사항으로 개최여건 지속적 개선 필요
- 종목별 공인 규격 경기장 확보 및 부대시설 정비
  - 경기장 및 부대시설 정비에 약 8억 원 이상 소요되어 연차별 개보수 추진

### ※ 개최지 결정 기준(전라남도 종합체육대회 규정)

제14조(전남체육대회 등의 개최지 결정) ① 종합체육대회 개최지는 대회 개최 연도로부터 2년 전까지 결정하여야 하며, 유치를 신청한 회원시군체육회의 유치신청서류를 기준으로 위원회의 예비심사 후 전라남도의 협의를 거쳐 이사회가 최종 결정한다.

② 삭제

③ 전남체전 미개최 군이 유치 신청할 경우 우선권을 부여하며, 미개최 군을 제외한 유치 희망 회원 시군체육회가 2개 이상일 경우에는 개최년도가 가장 오래된 회원 시군체육회순으로 부여하되 유치신청서류를 기준으로 위원회의 예비심사를 거친다.

## □ 향후계획

- 제65회 전남도민체전 유치 신청 : 2023. 10월 중
- 개최지 결정 : 2024. 4월 중

사업부서

스포츠산업과장 김용헌 체육진흥팀장 구자흥(2191) 담당자 김현호(2192)

남녀노소 모두가 함께 소통 및 화합으로 군민의 삶의 질 향상 및 체육 인프라 확충으로 군민의 건강 및 편의 증진

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	179(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	15%	<b>추진부서</b> 스포츠산업과

□ 사업개요

- 기 간: 2020. 5. ~ 2025. 10.
- 장 소: 전남 구례군 구례읍 봉북리 1423-1
- 사업비: 17,900백만 원(기금 4000, 도비 3,300, 군비 10,600)
- 내 용: 건축 1동(연면적 4,540㎡, 지상 2층, 지하 1층)
  - 국민체육센터, 생활문화센터, 주거지 주차장
- 예산과목
  - 부서) 스포츠산업과 정책) 공공시설물유지관리 단위) 구례 웰니스 복합센터 건립  
세부) 국민체육센터, 생활문화센터, 주거지주차장 조성 편성목) 시설비 및 부대비

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	17,900		900	9,000	8,000				5,400		900	4,500			
국비	4,000		200	2,600	1,200				2,800		200	2,600			
도비	3,300		200	1,900	300	900			2,100		200	1,900			
군비	10,600		500	4,500	1,600	4,000			500		500				
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 2021. 9.: 생활SOC 복합화사업 선정
- 2022. 5.: 기본 및 실시설계 용역 발주
  - 도 급 사: (주)리가온건축사사무소(도급액: 651,700,000원)
  - 용역기간: 2022. 6. 3. ~ 2023. 1. 28.
- 2022. 11.: BF 예비 인증과 관련 실시설계 용역 일시정지
  - BF인증기관: 한국건물에너지기술원(2023년 4월 접수 예정)
- 2023. 5.: 공사기간 산정 및 적정성 검토 용역 발주
- 2023. 6.: 설계 경제성검토(VE) 용역 발주
- 2023. 6.: 웰니스 복합센터 타당성 용역 발주
- 2023. 8.: 경관 및 공공디자인 공동심의 진행

## □ 향후계획

- 2023. 11.: BF예비인증 취득 및 실시설계 용역 일시정지 해제
- 2023. 11.: 지방건설기술심의 진행
  - 건설기술진흥법 시행령 제17조제2항제3호
- 2023. 12.: 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2024. 03.: 통합건설사업관리 용역 발주
- 2024. 03.: 구례 웰니스 복합센터 총괄분 및 1차분 발주
- 2024. 04.: 구례 웰니스 복합센터 건립공사 착공
- 2025. 10.: 구례 웰니스 복합센터 건립공사 준공

## □ 문제점 및 대책

- BF 예비인증 관련 공정기간 지연
  - BF 예비인증이 예정일보다 늦어져 전체적인 공정기간 지연

사업부서

스포츠산업과 김용현 시설안전팀장 박성준(2747) 담당자 최재영(2242)

실내수영장을 유아,노인 등 취약계층 전용 수중운동 프로그램을 운영하여 군민건강 증진 및 체육복지 실현

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	25(백만 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	50%	<b>추진부서</b> 스포츠산업과

□ 사업개요

- 추진기간 : 2025. 1. 1. ~ 2025. 11.(10개월)
- 추진방법 : 용역계약(프로그램 운영)
- 소요예산 : 25백만원(군비) 2024예산 확보계획
- 사업내용
  - 영유아 대상 : 생존수영교실 프로그램 운영
  - 고령자 대상 : 아쿠아로빅 수중체조교실 프로그램 운영
  - 일반인 대상 : 농부증 재활 수중재활운동교실 프로그램 운영

□ 지금까지 추진사항

- 공약사업 추진을 위한 2024년 사업계획 수립 보고(2023. 8)  
→ (군수님 지시사항) 웰니스복합센터 준공 후 시행

□ 향후계획

- 웰니스복합센터 준공 후 사업 추진(준공 예정일: 2025. 10.)  
→ 본 공약사업은 장기계획사업으로 분류하고 웰니스복합센터 준공 예정일에 맞춰 추후 사업계획 수립

사업부서

스포츠산업과 김용헌 시설관리팀장 문봉열(2195) 담당자 고상근(2160)

# 지 역 개 발 과

- 【P8-01】 구례자연드림3단지 유치
- 【P8-03】 구례읍사무소를 중심으로 청년허브 조성
- 【P8-04】 기업 스마트 오피스 단지 조성
- 【P8-07】 아이쿱 고급 치유병원 유치
- 【P8-10】 공공청사 군청 주변 집적화 추진
- 【P8-18】 화엄 관광르네상스(블루투어·화엄상가 재정비)
- 【P8-19】 친환경 자전거 인프라 구축
- 【P8-31】 구례읍 도시재생사업 추진
- 【P8-32】 백련천 생태문화로드 조성

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	473(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	15%	<b>추진부서</b> 지역개발과

□ 사업개요

- 기 간: 2022. ~ 2027.
- 장 소: 구례군 산동면 둔사리 일원
- 면 적: 약 534천㎡
- 사업비: 47,336백만 원(도비 3,052, 군비 44,284)
- 내 용
  - 치유클러스터 조성(치유병원, 치유식품 생산단지 등)
  - ※ 민간투자: 2,170억 원, 고용 1,000명 / 병원, 호텔, 생산시설 등

□ 지금까지 추진사항

- 2022. 10.: 관계기관 협의 등(전남도)
- 2022. 12.: 주민 설명회 개최 및 2023년 공유재산관리계획 반영
- 2023. 2.: 투자협약(MOU) 체결
- 2023. 4.: LH토지주택연구원 사전 컨설팅
- 2023. 6.: 전남도 지역개발계획 변경 신청
- 2023. 8.: 현장점검(국토부, 토지주택연구원 등)
- 2023. 8.~: 토지협의 매수 추진


□ 향후계획

- 2023. 10.: 국토정책위원회 심의(국토부)
- 2023. 11.: 지역개발구역 지정 용역
- 2024. 1.: 기본 및 실시설계 용역
- 2025. 3.: 토지보상 완료 및 공사 착공(준공: 2027. 12.)

사업부서

지역개발과장 박병수 투자유치팀장 김용만(2826) 담당자 윤선교(2827)

## 현황사진

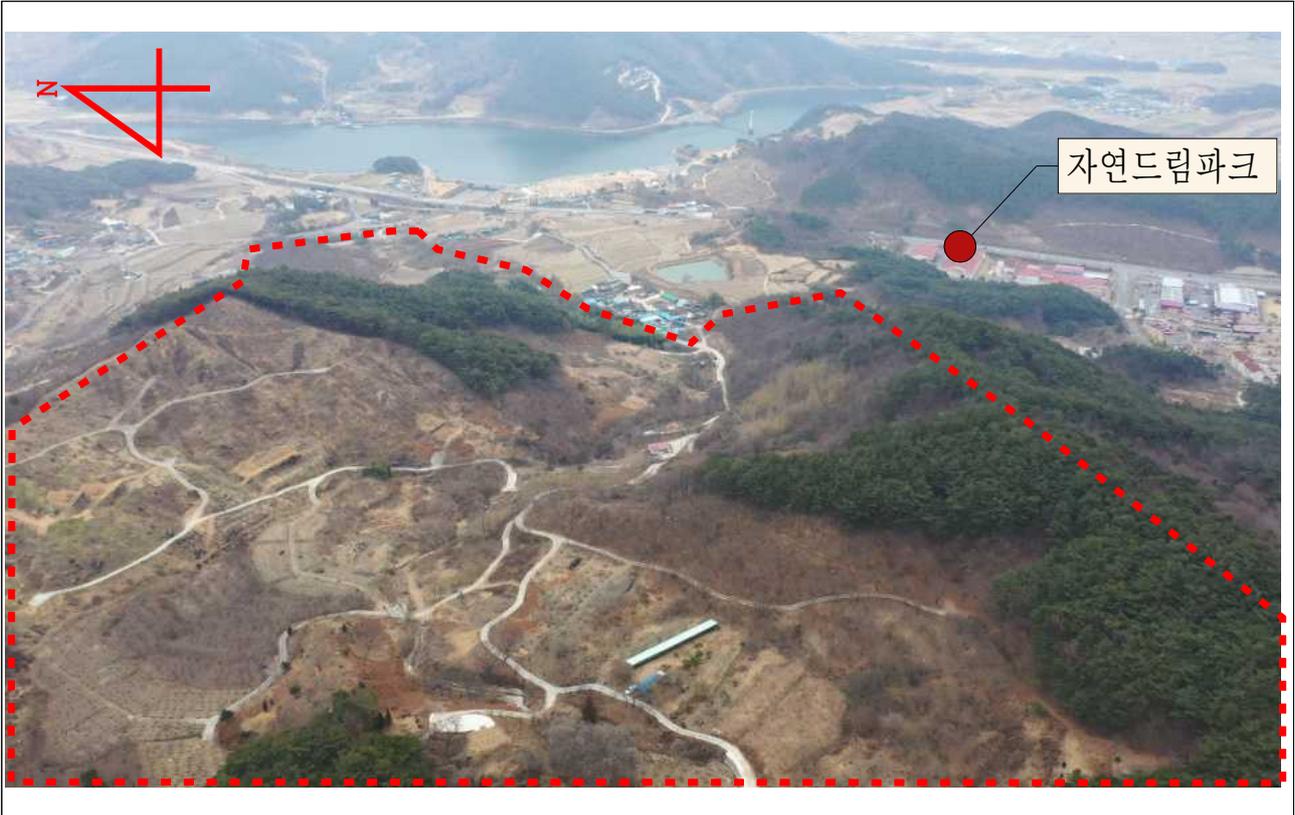

## 위치도



구례군 인구활력 공간 조성을 위해 이전 계획 중인 구례읍사무소와 인근 유희시설을 연계해 지역의 관광, 청년 유입의 거점을 마련하고자 함.

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	47.24(억 원)	<b>추진부서</b>	지역개발과
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	5%		

□ 사업개요

- 기 간: 2023. 1. ~ 2024. 12.(2년간)
- 장 소: 구례군 구례읍 봉동리 295-1 일원
- 사업비: 47.24억 원(국비 3.81, 도비 0.63, 군비 1.9, 기금 40.9)
- 내 용:
  - 지역관광 종합 안내 기능을 수행할 구례 관광청 조성
  - 구례정착을 위한 창업공간 구레스토어 조성
  - 미디어 실험실 구레 스튜디오 조성

□ 세부계획

- 2023. 2.: 구레 활력타운(구레스토어) 투자 심사
- 2023. 4.: 건축기획 용역 착수
- 2023. 10.: 행정 사전절차 이행[공건건축 사전검토, 공공건축심의]
- 2023. 10.: 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2024. 2.: 읍사무소 이전
- 2024. 5.: 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2024. 6.: 구레스토어 및 명예군민자치센터 착공
- 2024. 12.: 구레스토어 및 명예군민자치센터 완공

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	4,733	634	-	1,910	2,180				4,733	634	-	4,090	-		
국비	381	381	-	-	-				381	381	-	-	-		
도비	63	63	-	-	-				63	63	-	-	-		
군비	190	190	-	-	-				190	190	-	-	-		
기타	4,090	-	-	1,910	2,180				4,090	-	-	4,090	-		

□ 지금까지 추진사항

- 지방소멸대응기금 확보
  - 지방소멸대응기금 공모 신청 : 2022. 5.
  - 백련문화로드 기금 확보 : 2022. 9.
- 투자 심사 및 설계 용역 추진
  - 투자 심사 : 2023. 2.
  - 기본 설계 및 실시설계 용역 착수 : 2023. 10.
- 공공건축 사전검토 : 2023. 7.
  - 공공건축 심의 : 2023. 10.

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2024. 5.
- 공사 추진
  - 착공 : 2024. 6.
  - 완공 : 2024. 12.

## 현황사진



## 위치도



<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input type="checkbox"/> 기 타 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	75(억 원)	<b>추진부서</b>	지역개발과
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	15%	

### □ 사업개요

- 기 간: 2021. ~ 2024.
- 장 소: 구례군 산동면 일원(장소 미정)
- 사업량: 연면적 A=10,000㎡ 이상
- 규 모: 업무시설 3동(40평 규모), 숙박 30동(20평 규모)
- 사업비: 약 7,500백만 원(민자)
- 내 용
  - 지리산 등 자연 환경을 이용한 ICT기반 거점 힐링 오피스 조성
  - 거점 오피스 공간과 유기적으로 연결된 스마트 주거단지 조성

### □ 지금까지 추진사항

- 2021. 1.: 타당성 조사 용역 시행
- 2022. 11.: 민간 투자유치 대상지 조사(산동면 탐정리 일원2개소)
- 2023. 1.~: 민간 투자기업 유치 활동

### □ 문제점 대책

- 금리인상, 기업경기 위축 등으로 민간 투자 위축 되었으며,  
군 예산으로 직접 추진 곤란
  - ⇒ 토지 확보 어려움으로 신규 단지 조성 지양하고 기존 사업과 병행 추진 필요  
(ex. 지리산 치유농업캠퍼스, 워킹촌스데이 in 구례 등)
  - ⇒ 삼도홀딩스(주) 투자의향 타진(약 10만평 규모 삼학 소주 제조·연구 단지 등)

### □ 향후계획

- 2023. 10.~: 민간 투자기업 유치 활동 지속 및 유치 대상지 재검토

사업부서

지역개발과장 박병수 투자유치팀장 김용만(2826) 담당자 윤선교(2827)

**현황사진**

※ 산동면 탑정리 산 33-2번지 일원(88천 m<sup>2</sup>)




**위 치 도**



**현황사진**

※ 산동면 탑정리 산 42-1번지 일원(105천 m<sup>2</sup>)

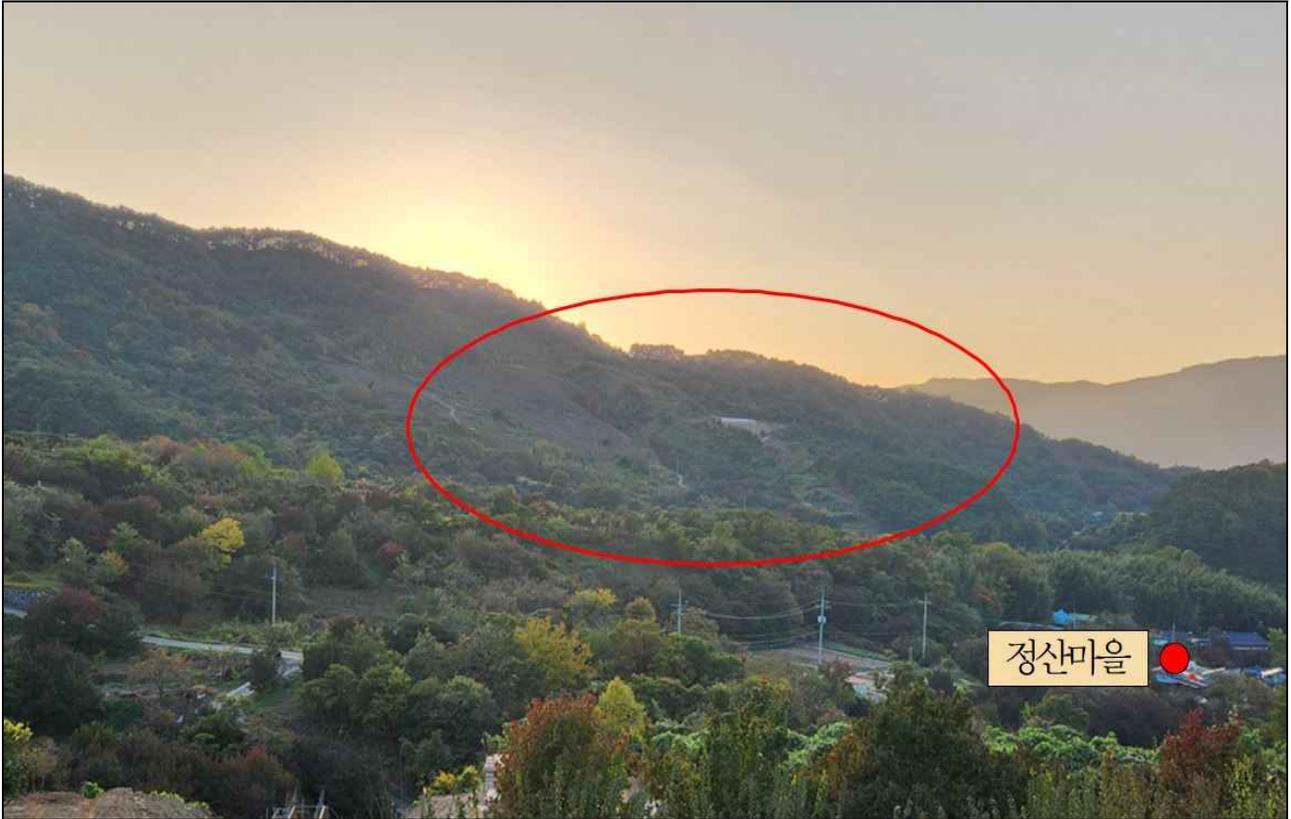

**위 치 도**



<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input type="checkbox"/> 기 타 <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>예산구분</b>	예 산 <input type="checkbox"/> 비예산 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	630(억 원)			
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b>	지역개발과

**사업개요**

- 기 간: 2025. ~ 2027.
- 장 소: 구례군 산동면 이평리(치유·힐링클러스터)
- 사업비: 630억 원(민자)
- 내 용: 만성질환자 치료 및 암환자 케어 전문 병원 유치


**지금까지 추진사항**

- 2020. 1.~: 투자유치 활동 및 아이쿱생협 경영진 면담
- 2021. 12.: 치유병원 투자 결정(규모 500병상, 아이쿱생협)
- 2023. 2.: 투자협약(MOU) 체결 및 투자 준비(민간)


**향후계획**

- 2024. 10.: 인허가 절차 추진(민간)
  - 의료법인 설립, 건축허가, 군계획위원회 심의 등
- 2025. 3.: 공사 착공(민간)
- 2027. 12.: 공사 준공 및 운영(민간)

## 현황사진

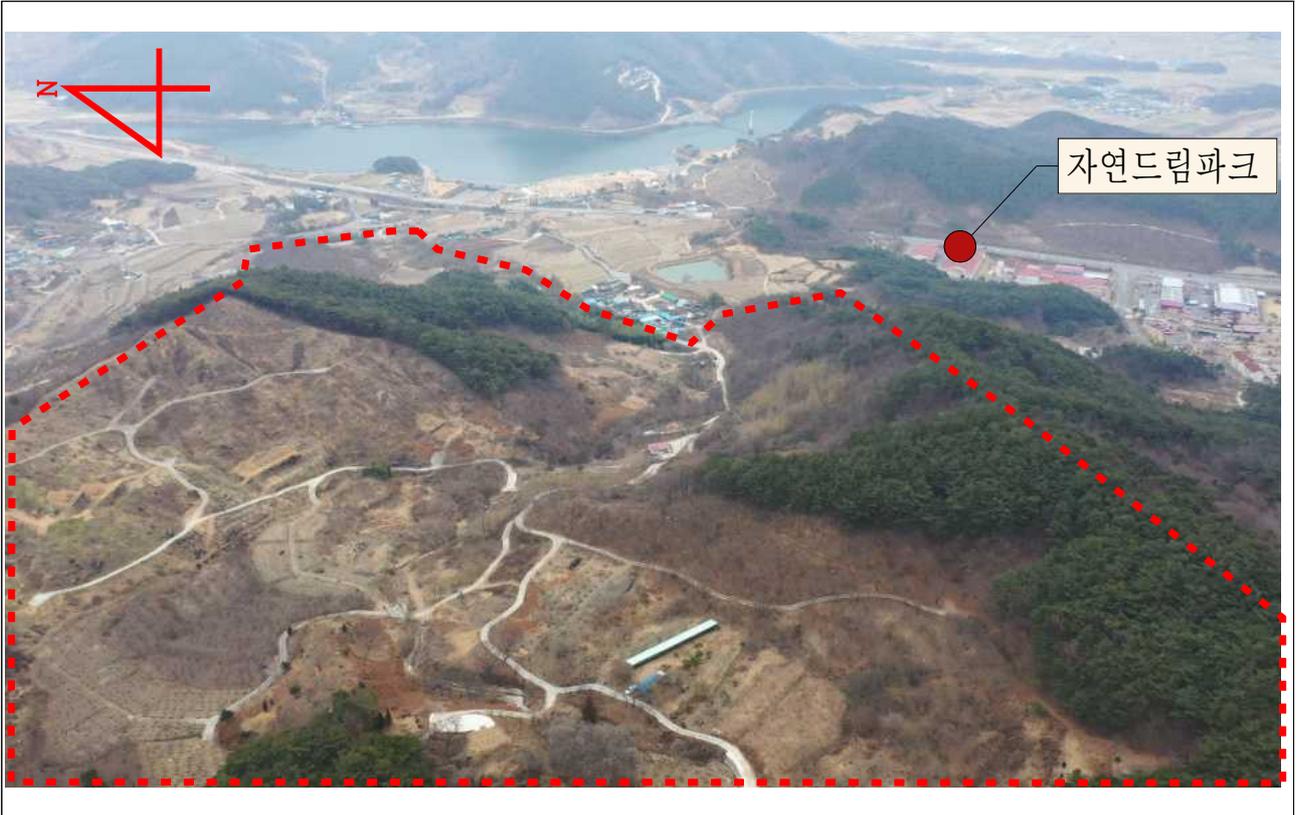

## 위치도

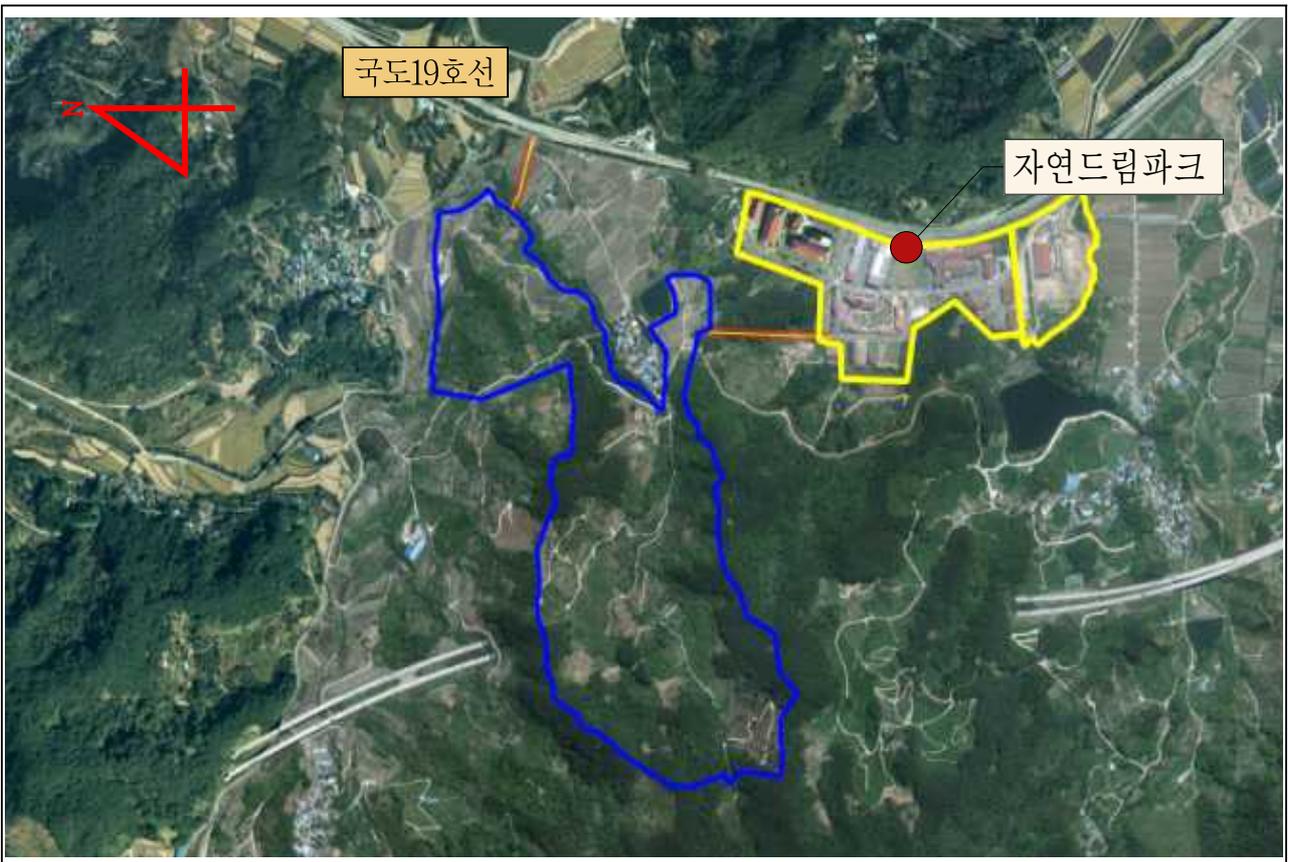

**P8-10**

**공공청사 군청 집적화 추진**

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	250(억 원)	<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □
<b>추진상황</b>			<b>추진율</b> 10%	<b>추진부서</b>	지역개발과

**□ 사업개요**

- 기 간: 2022. 7. ~ 2026. 12.
- 장 소: 구례읍 봉서리 일원
- 사업비: 25,000백만 원(군비)
- 내 용: 공공기관 이전부지 확보
  - 관내 공공기관 및 금융기관 등 이전(4~5개 이전 수요기관 이전계획 수립)
  - 공공 · 주거 · 지원기능 및 기반시설 설치

**□ 지금까지 추진사항**

- 2022. 7. ~ 2023. 2. : 관내 공공기관 이전수요 조사
- 2023. 6.: 군관리계획(재정비)(안) 행정절차 추진

**□ 문제점 및 대책**

- 지역활력타운 공모 미선정에 따른 2024년 지역활력타운 공모 재신청 필요

**□ 향후계획**

- 2023. 12.: 군관리계획(재정비)(안) 결정 및 지형도면 고시
- 2024. 3.: 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 용역 착수
- 2024. 12. ~ 2025. 6.: 토지보상 추진
- 2025. 7.: 단지 및 기반시설 착공
- 2026. 12.: 공사 준공

**사업부서**

지역개발과장 박병수 도시계획팀장 최준섭(2821) 담당자 양동필(2824)

## 현황사진



## 위치도



P8-18-A

## 화엄사권역 관광 르네상스사업 추진

- 화엄4색 블루투어 프로젝트

<b>사업구분</b>	신규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	108(억 원)	<b>추진부서</b>	지역개발과
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	70%	

### □ 사업개요

- 기간: 2020. 1. ~ 2024. 12.
- 장소: 마산면 황전리 520-11번지 일원
- 사업비: 10,800백만 원(도비 5,000, 군비 5,800)
- 내용: 화엄4색 블루투어 프로젝트 1식
  - 테마관광열차 시스템 구축, 음이온길 조성, 복합문화공간 조성
  - 정원문화의 거리 조성

### □ 지금까지 추진사항

- 2019. 9.: 전남형 지역성장 전략 공모사업 선정
- 2020. 12.: 실시설계 용역 추진
- 2021. 9.: 기본계획 승인(전남도)
- 2021. 11.: 전라남도 계약심사 완료
- 2021. 12.: 정원 문화의 거리 공사 착공
- 2023. 5.: 친환경 순환열차 계약의뢰(조달청)
- 2023. 9.: 복합문화공간 공사 착공

### □ 향후계획

- 2023. 10. ~ 11.: 친환경 순환열차 계약 추진
- 2024. 5.: 친환경 순환열차 시범운영
- 2024. 12.: 공사 준공

사업부서

지역개발과장 박병수 도시계획팀장 최준섭(2821) 담당자 김수지(2823)

## 현황사진



## 위치도



P8-18-A

**화엄사권역 관광 르네상스사업 추진**  
- 화엄상가 재정비

<b>사업구분</b>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	153(억 원)	<b>추진부서</b>	지역개발과
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%	

**사업개요**

- 장 소: 마산면 황전리 571-9번지
- 시설현황: 57개소(부지면적 4,496㎡, 건축면적 2,506.88㎡)
  - 상가현황 47개소 중 13개소 운영(음식점 8, 유흥업소 4, 판매점 1)
  - 주택현황 10개소
- 총사업비: 153억 원(균특 50%, 균비 50%) 건물매입비 별도
- 사업내용: 폐상가시설을 활용한 문화재생사업 추진

**지금까지 추진사항**

- 2019.: 화엄상가 폐상가 시설 협의 및 수용협의
- 2023. 4. 10. ~ 4. 19.: 화엄상가 소유자 의견 수렴
  - 소유자 총 57명 중 40명 의견

구분	군 매 각	매각불가
40	36	4

- 2023. 8. ~ 9.: 매각불가 소유자 협의 실시(화엄상가 번영회)

**문제점 및 대책**

- 현재 영업하고 있는 상가를 제외한 나머지 상가시설에 대한 협의 및 수용 필요하나 소유자가 원하는 보상비와 가감평가 차이가 커 협의 매수 추진 어려움 예상됨.(예상매입비 6,400백만 원)

- 군계획시설 지정 시 공익사업법에 따라 수용대상이 되나, 현재 영업 중인 유흥주점 등의 폐업이 전제되어야 함.
- 의견 수렴 결과 일부 매각이 불가하다는 의견이 있어 건물 전체 매수 및 활용에 어려운 실정임.

사업부서

지역개발과장 박병수 도시계획팀장 최준섭(2821) 담당자 김수지(2823)

## 현황사진



## 위 치 도



<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>	
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	18.4(억 원)			
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	90%	<b>추진부서</b>	지역개발과

□ 사업개요

- 자전거도로 사고위험지역 개선
  - 사업기간: 2021. 10. ~ 2023. 10.
  - 위 치: 구례읍 중앙초사거리 ~ 구 문척교 입구
  - 사 업 량: L=1.0km, B=3.0m(자전거도로: 1.5m, 인도: 1.5m)
  - 사 업 비: 600백만 원(특교 200, 군비 400)
  - 사업내용: 자전거도로 개설
- 자전거 스테이션 조성사업
  - 사업기간: 2021. 10. ~ 2023. 12.
  - 위 치: 구례읍 신월리 339-5 외 17필지(3,400㎡)
  - 사 업 비: 1,220백만 원(특교 200, 군비 1,020)
  - 사업내용: 자전거 스테이션 조성, 공유자전거 시스템 구축 등

□ 지금까지 추진사항

- 자전거도로 사고위험지역 개선
  - 2021. 6.: 행정안전부 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업 공모 선정
  - 2021. 8. ~ 10.: 실시설계 용역 완료
  - 2022. 2.: 사업착공
  - 2022. 12.: 지장물 보상 완료
- 자전거 스테이션 조성사업
  - 2021. 6.: 행정안전부 자전거도시 브랜드화 지원사업 공모 선정
  - 2021. 10.: 실시설계용역 추진

- 2022. 3.: 자전거 스테이션 부지 매립 완료
- 2022. 12.: 사업 착공

## □ 향후계획

### ○ 자전거도로 사고위험지역 개선

- 2023. 10.: 사업 준공

### ○ 자전거 스테이션 조성사업

- 2023. 12.: 자전거스테이션 조성사업 준공
- 2024. 3.: 공유자전거 주차장 및 거점 조성

## 현황사진



## 위치도





지역 쇠퇴를 사전에 예방할 수 있도록 특화자원 및 인적자원을 활용하여 생활SOC 확충과 기반시설을 정비하고, 주민역량강화를 통한 일자리창출 및 공동체 활성화에 기여하고자 함

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 ■	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ <b>전남도</b> □ <b>사업주체</b> 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	569(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □	<b>추진율</b>	20%	<b>추진부서</b> 지역개발과

□ 사업개요

- 기 간: 2019. 1. ~ 2025. 12.
- 장 소: 구례군 구례읍 봉동리·봉남리·봉북리 일원
- 사업비: 569억 원(일반근린형 175, 중심시가지 294, 우동살 100)
- 내 용:
  - 일반근린형: 통합어울림센터, 그때그날기록관, 복합주차장 등
  - 중심시가지형: 삼대삼미플랫폼, 구례 어울림센터, 삼대 어울림한마당 등
  - 우리동네살리기형( '24 공모 신청): 공유 거점시설 조성, 집수리, 가로 경관개선 등

□ 세부계획

- 2019. 10.: 일반근린형 사업 선정(읍사무소 일원)
- 2020. 12.: 중심시가지형 사업 선정(5일시장 일원)
- 2022. 12.: 일반근린형 중대한 변경 국토부 특별위원회 승인
- 2023. 03.: 일반근린형 중대한 변경 고시
- 2023. 10.: 중심시가지형 경미한 변경 추진(규모 조정)
- 2023. 11.: 일반근린형 경미한 변경 추진(기간 연장)
- 2024. 07.: 우리동네살리기형 신규공모 신청

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	56,980	9,208	13,755	10,118	2,934	14,165	4,600	2,200	44,360	10,147	9,203	15,729	7,065	2,216	-
국비	29,000	5,524	5,293	2,984	2,534	8,665	3,000	1,000	23,440	5,105	4,056	8,711	4,239	1,329	-
도비	14,733	921	5,008	5,104	300	2,700	500	200	1,333	921	412	-	-	-	-
군비	13,247	2,763	3,454	2,030	100	2,800	1,100	1,000	17,627	4,121	4,735	5,058	2,826	887	-

## □ 지금까지 추진사항

### ○ 일반근린형

- 2022. 3.: 통합어울림센터 착공
- 2022. 12.: 활성화계획 중대한 변경 국토부 승인
- 2023. 2.: 활성화계획 중대한 변경 전남도 도시계획위원회 추진
- 2023. 3.: 도시재생 활성화계획 중대한 변경 고시
- 2023. 5.: 집수리 지원 사업 추가분 완료(133가구)

### ○ 중심시가지형

- 2022. 3.: 구례어울림센터 토지보상
- 2022. 7.: 위수탁 시설물(삼대플랫폼, 어울림센터) 공공건축 사전검토
- 2023. 3.: 활성화계획 경미한 변경 국토부 컨설팅
- 2023. 3.: 삼대삼미 플랫폼 및 어울림센터 사전 행정절차 이행
- 2023. 9.: LH위탁사업 및 임대주택 관련 군비부담금 협의
- 2023. 9.: LH위탁사업 및 임대주택 관련 전남도 협의

### ○ 우리동네살리기형

- 2023. 6.: 공모 신청
- 2023. 9.: 국토부 도시재생특별위원회 최종 결과 발표(미선정)
- 2023. 10.: 우리동네살리기형 신규공모 용역 완료

## □ 향후계획

### ○ 일반근린형

- 2023. 12.: 도시재생 활성화계획 경미한 변경 추진(기간연장)
- 2024. 2.: 통합어울림센터 준공 및 사업완료
- 2024. 3.: 복합주차장 및 세포마켓 실시설계 추진
- 2024. 4.: 읍사무소 리모델링 착공(그때그날기록관)
- 2024. 5.: 복합주차장 및 세포마켓 착공
- 2025. 6.: 그때그날기록관 및 세포마켓 완공
- 2025. 8.: 세포마켓 창업점포 운영
- 2025. 10.: 복합주차장 완공

### ○ 중심시가지형

- 2023. 12.: 도시재생 활성화계획 경미한 변경 승인(국토부)
- 2024. 3.: 삼대 어울림한마당삼대삼미 플랫폼어울림센터 현상설계
- 2024. 10.: 삼대 어울림한마당삼대삼미 플랫폼어울림센터 실시설계
- 2025. 5.: 삼대 어울림한마당삼대삼미 플랫폼어울림센터 착공
- 2026. 12.: 삼대 어울림한마당삼대삼미 플랫폼어울림센터 준공

### ○ 우리동네살리기형

- 2024. 1.: HUG지원기구 사전 컨설팅 및 계획 보완
- 2024. 3. ~ 5.: 사전 행정절차 이행
- 2024. 6.: 기본계획 수립 공모사업 신청
- 2024. 7. ~ 9.: 신규 공모사업 평가

## □ 문제점 및 대책

### ○ 세포마켓 사업 운영에 대한 행정절차 이행 후 신속 추진

- 주민 역량강화 프로그램과 연계하여 운영하여, 시설 준공 후 창업 점포 창업자 연계

### ○ 통합어울림센터 기성 독려 및 완공에 따른 읍사무소 이전의 사전 절차 이행

- 통합어울림센터의 시공이 신속 추진 될 수 있도록 감리단과 지속 회의 추진
- 읍사무소 이전에 필요한 관련 부서 협의를 추진 예정
- 그때그날기록관의 실시설계, 설명회, 문화재청 협의 등 착공 전 사전 행정절차 이행

사업부서

지역개발과장 박병수(2408) 도시재생팀장 정 길(2831) 담당자 박철우·정광석·이희(2832)

# 현황사진



# 위치도



인구활력거점에서 생성된 활력을 도심 전체로 확산할 연결통로(백련천)을 도시재생 사업과 연계하여 관광객들의 도심으로의 연계방문 유도하고 주민이 사랑하는 공간으로 탈바꿈 하고자 함

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ <b>전남도</b> □ <b>사업주체</b> 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	20(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b> 지역개발과

□ 사업개요

- 기 간: 2022. 10. ~ 2024. 12.
- 장 소: 현충공원 ~ 목월빵집(1.1km)
- 사업비: 2,000백만원(지방소멸대응기금 2,000백만원)
- 내 용: 데크 정비 및 조명설치, 쉼터정비, 페인팅 및 벽화

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	2,000	-	100	900	1,000	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-
준비	2,000	-	100	900	1,000	-	-	-	2,000	-	100	1,900	-	-	-

□ 지금까지 추진사항


- 지방소멸대응기금 확보
  - 지방소멸대응기금 공모 신청 : 2022. 5.
  - 백련문화로드 기금 확보 : 2022. 9.

- 투자 심사 및 설계 용역 착수
  - 투자 심사 : 2022. 9.
  - 기본 설계 및 실시설계 용역 착수 : 2022. 12.
- 기본 설계 및 실시설계 추진 : 2023. 7.

## □ 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2023. 11.
- 공사 추진
  - 사전 행정절차 이행 : 2023. 11.
  - 착공 : 2023. 12.
  - 완공 : 2024. 12.

## 현황사진

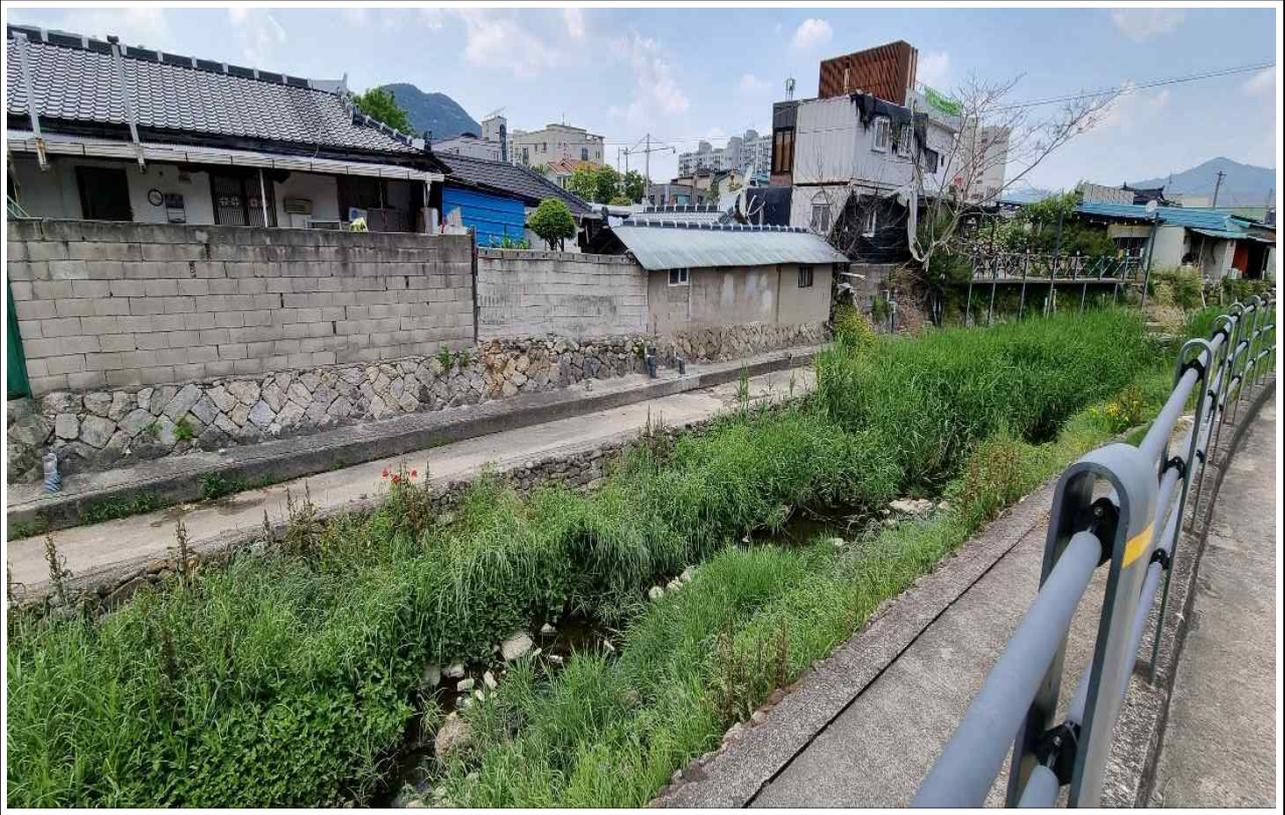

## 위치도



# 경 제 활 력 과

**【P8-06】 생활형 영세 소상공인 카드수수료 지원(완료)**

**【P8-39】 청년 거주시설 「청년하우스」 조성**

**【P8-05】 구례읍 상권 르네상스 사업 추진 (장기계획)**

**【P8-23】 문척면 「섬진강 나루장터」 조성 (장기계획)**

P8-6

## 생활형 영세 소상공인 카드수수료 지원(완료)

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	14.4(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 ■ 정상추진 □ 일부추진 □	<b>추진율</b>	100%	<b>추진부서</b>	경제활력과

## □ 사업개요

- 기 간: 2023. 8. ~ 예산소진 시까지
- 대 상: 전년도 매출액 3억 원 이하 관내 소상공인으로 지방세 및 세외수입 체납액이 없는 자
- 사 업 비: 288,000천 원(군비)
- 내 용: 전년도 카드 매출액 카드수수료의 0.5% 지원(최대 50만 원)

## □ 지금까지 추진사항

- 2023년 사업계획 수립: '22. 10.
- 세부기준 검토 및 예산확보(2회 추경): '23. 8.
- 사업추진(신청접수 및 지급): '23. 9. 20. ~ 12. 31.
- 9월 카드수수료 지원: 50명, 14,740,590원

☞ 공약취지에 맞게 사업목적을 달성하였으므로 공약이행도 '완료' 로 변경

## □ 향후계획

- 매월 접수 후 다음 달 지급: '23. 12. 31.까지
- 2024년 사업계획 수립 및 예산확보: '23. 12.
- 2024년 사업추진: '24. 8. ~ 12.

사업부서

경제활력과장 김병노 지역경제팀장 황남경(2621) 담당자 김단비(2622)

P8-40

## 청년 거주시설 「청년하우스 조성」

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	75(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b>	경제활력과

### □ 사업개요

- 기 간: 2022. 10. ~ 2025. 12.
- 위 치: 구례군 구례읍 봉서리 1080번지 일원
- 대지면적: 2,683㎡
- 사 업 비: 75억 원(도비 42, 지방소멸대응기금 33)
- 규 모: 임대주택 1동(9층, 32세대, 연면적 2,400㎡ 내외)
  - 1층: 코워킹스페이스, 편의시설(무인세탁실 등)
  - 2층~9층: 거주시설(12평 24세대, 14평 8세대)

### □ 청년 하우스 세부시설 계획(안)

구 분	주요시설	내 용	비 고
1층	코워킹스페이스 	· 거주하면서 사무할 수 있는 공간	
	무인세탁실 	· 무인 세탁실	
	무인편의점 	· 무인 편의점	
2층 ~9층	거주공간 	· 청년 및 신혼부부 거주공간	32세대

## □ 지금까지 추진사항

- 2022. 12.: 기본계획 수립 및 타당성 용역 완료(19,800천 원)
- 2023. 2.: 지방재정 투자심사 의결(도)
- 2023. 3.: 업무이관(지역개발과 공공건축팀)
- 2023. 6.: 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2023. 6.: 군관리계획 변경 용역 발주(44,400천 원)
- 2023. 9.: 공공건축심의위원회 의결(군)
- 2023. 10.: 건축기획업무 용역 완료(18,900천 원)
- 2023. 10.: 설계 용역 계약심사 완료(도)
- 2023. 10.: 부지 내 지방하천 경계구역 분할 완료
- 2023. 10.: 설계 공모 추진 중

## □ 향후계획

- 2023. 12.: 기본 및 실시설계 추진
- 2024. 7.: 계약심사(도) 및 입찰공고
- 2024. 8.: 청년하우스 착공
- 2025. 9.: 청년하우스 입주자 모집 계획 확정
- 2025. 11.: 청년하우스 입주자 모집
- 2025. 12.: 청년하우스 준공 및 입주

## 현황사진



## 위치도



# 건 설 과

**【P8-15】 지리산 피아골 순환도로 개설 완료**

**【P8-33】 수해 걱정 없는 도시환경 조성**

**【P8-35】 국도 18·19호선 확포장 국가계획 반영**

## P8-15 지리산 피아골 순환도로 개설

피아골 계곡과, 연곡사를 찾는 탐방객이 여름과 단풍철에 집중되면서 교통체증 심각, 주민숙원사업 해결 및 지역균형 발전 도모

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ <b>사업주체</b> 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	110(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 □ 완료 후 계속 □ 정상추진 ■ 일부추진 □	<b>추진율</b>	50%	<b>추진부서</b> 건설과

### □ 사업개요

- 기 간: 2019. ~ 2026.
- 장 소: 구례군 토지면 내서리 ~ 내동리 일원
- 사업비: 110억 원
- 사업량: 도로개설 L=2km(B=7m), 도로확장 L=1.8km
- 내 용: 조동~원기 구간 도로 개설, 교행공간 확보 및 도로 선형개선

### □ 예산계획

- 2022년 명시이월예산 및 2023년 본예산 1,500백만 원 확보
- 2024년 1구간 사업 준공 이후, 2구간 사업비 8,500백만 원 중 부족분 7,247백만 원 신청예정

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	11,000	753	1,500	1,500	2,400	2,400	2,447		3,753	753	1,500	1,500			
국비															
도비	500		500						500		500				
군비	10,500	753	1,000	1,500	2,400	2,400	2,447		3,253	753	1,000	1,500			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 2019. 1. ~ 12.: 생태자연도 사전조사, 기본설계 완료
- 2020. 1. ~ 9.: 1구간 실시설계 및 소규모환경영향평가 완료
- 2021. 4.: 생태자연도 고시 도엽(도면) → 1등급 지역해지
- 2021. 5. ~ 11.: 1구간 토지분할편입 토지보상 완료
- 2021. 12.: 2구간(1.3km) 측량 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 3.: 주민설명회 개최 및 노선 측량 완료
- 2022. 4. ~ 12.: 노선 확정 및 소규모환경영향평가 용역 추진
- 2023. 5.: 2구간(1.3km) 실시설계 용역 타절
- 2023. 6.: 1구간 사업 발주


## □ 향후계획

- 피아골 순환도로 미개설(0.7km) 1구간 사업 발주 완료하였으며, 2024년 6월 완료예정(조동~원기)
- 농어촌도로 205호선의 일부구간 정비(교행공간 확보, 선형 개선) 추진을 위한 사업비 5억 원 추가확보 필요

## □ 문제점 대책

- 소규모환경영향평가(2구간)에 대해 ‘부동의’ 의견통보
  - ※ 생태·자연도 1등급 지역과 인접함에 따라, 생태계 연결성 교란 등
- 1구간 사업발주 및 준공 후, 소규모 환경영향평가 재접수 예정

# 위치도

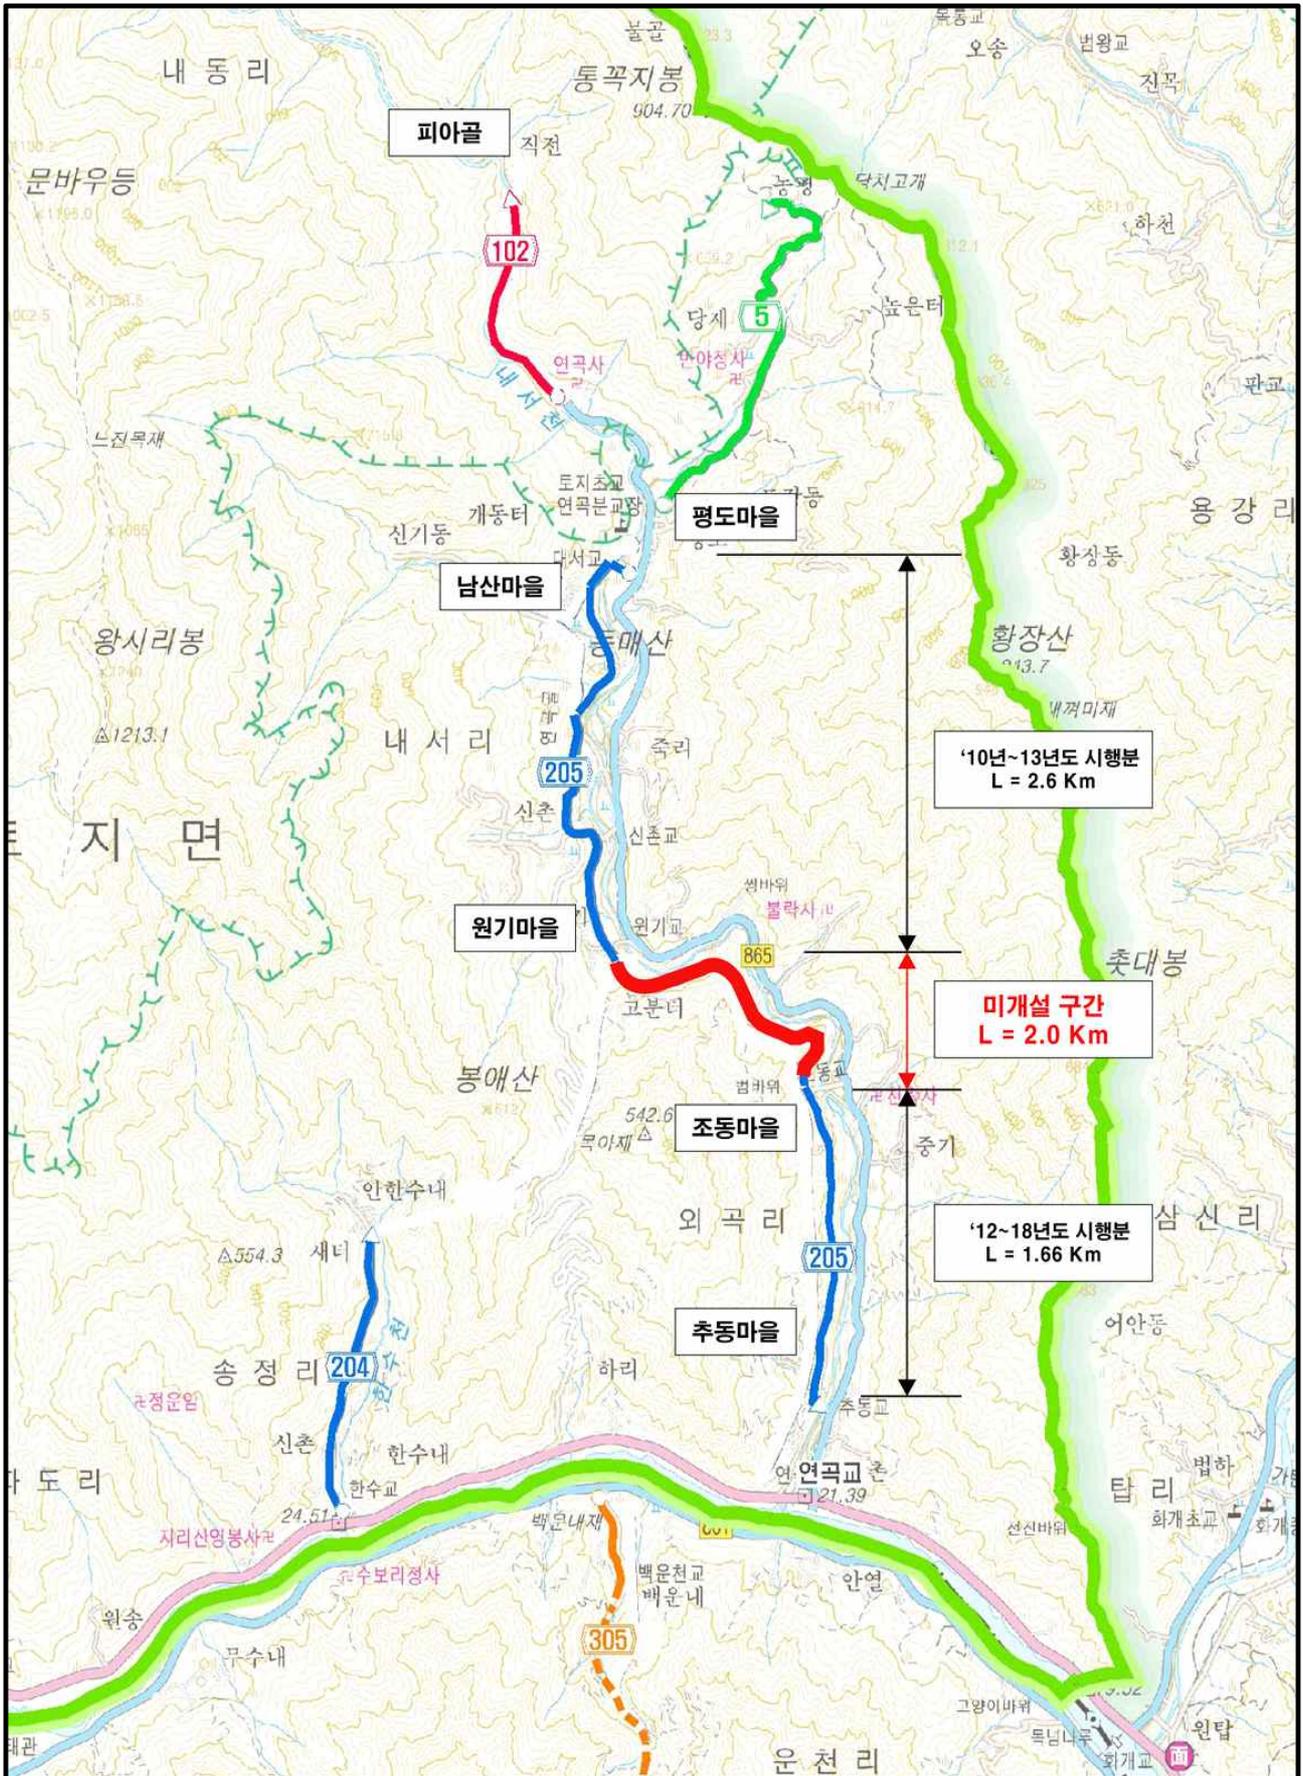

**P8-33**

**수해 걱정 없는 도시환경 조성**

지구단위종합복구사업을 통해 재해를 대비한 인프라 확충으로 안전한 생활환경 및 수해 걱정 없는 도시환경을 조성

<b>사업구분</b>	신규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>전남도</b> <input type="checkbox"/> <b>구례군</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>기 타</b> <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	1,774(억 원)	<b>사업주체</b>
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 82%	<b>추진부서</b> 건설과

**□ 사업개요**

- 사업기간: 2020. 10. ~ 2024. 4.
- 사업장소: 구례읍·문척·간전·토지·마산면 일원
- 사업비: 177,358백만 원
  - 배수펌프장 116,043, 지방하천 41,032, 소하천 20,283
- 사업내용
  - 배수펌프장 7개소(죽연, 구성, 월평, 냉천, 사도, 안촌, 봉소) 및 고지배수로(간전) 1개소
  - 지방하천 2개소(서시천, 백연천)
    - : 하천정비 4.58km, 교량 3개소(서시1교 등), 배수구조물 28개소
  - 소하천 5개소(봉서천, 죽연천, 구성천, 전천천, 월평천)
    - : 하천정비 4.971km, 교량 28개소, 배수구조물 37개소

**□ 예산계획**

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	177,358	155,018	22,340						177,358	155,018	22,340				
국비	148,735	148,735							148,735	148,735					
특교	6,283	6,283							6,283	6,283					
군비	22,340		22,340						22,340		22,340				

## □ 연도별 추진계획

연도	성과지표(추진계획)	추진율(%)	이행도
2022년 이전	• 2020. 9.: 구례군 지구단위종합복구사업 확정(행정안전부)	0	-
	• 2021. 8.: 중앙(행정안전부) 사전심의 완료	5	정상추진
	• 2021.12.: 실시설계 용역 완료	10	정상추진
	• 2021.11. ~ 12.: 소하천 5개소(4개 지구) 공사 착공	12	정상추진
	• 2021.12.: 배수펌프장 7개소 공사 착공	15	정상추진
2022	• (1분기) 2022. 1. ~ 2.: 지방하천 2개소(3개 지구) 공사 착공	17	정상추진
	• (2분기) 2022. 6.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 20%	25	정상추진
	• (3분기) 2022. 9.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 40%	45	정상추진
	• (4분기) 2022.12.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 50%	55	정상추진
2023	• (1분기) 2023. 3.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 60%	60	정상추진
	• (2분기) 2023. 4.: 소하천(5개소) 공사 준공	65	정상추진
	2023. 6.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 70%	70	정상추진
	• (3분기) 2023. 9.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 80%	80	정상추진
	• (4분기) 2023.12.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 93% · 배수펌프장 5개소 준공 · 지방하천 2개소(서시2지구, 백연천) 준공	93	정상추진
2024	• (1분기) 2023. 1~ 2.: 지구단위종합복구사업 전체 공정율 95% · 배수펌프장 2개소 준공 · 지방하천 1개소(서시1지구) 준공	95	정상추진
	• (2분기) 2023. 4.: 지구단위종합복구사업 전체 완료 · 서시1교 공사 준공	100	완료

## □ 지금까지 추진사항

- 2020. 9. 11.: 구례군 지구단위종합복구사업 확정(행정안전부)
- 2020. 10. ~ 2021. 7.: 섬진강 및 서시천 하천기본계획 협의(익산청 13회)
- 2021. 1. 4.: 기본 및 실시설계 용역 착수

- 2023. 1.: 서시1교 사업 추진계획 수립(감사원 감사결과 통보)
- 2023. 2.: 서시1교 실시설계용역 계약 및 착수
- 2023. 4.: 지구단위종합복구(소하천)사업 준공
- 2023. 8.: 서시1교 실시설계용역 완료
- 2023. 9.: 지구단위종합복구(서시1교)사업 착공
- ※ 2023. 10. 17. 현재 공사 추진 공정율: 82%

## □ 향후계획

- 2023. 12.: 지방하천(2개소) 공사 준공
- 2023. 12. ~ 2024. 2.: 배수펌프장(7개소) 종합 시운전 및 준공
- 2024. 4.: 서시1교 공사 준공 및 전체 사업 완료

## □ 현안사항 [서시1교 사업 추진]

- “댐 하류지역 감사원 감사” 결과 서시1교 사업 추진
  - 국도 교량(서시교, 서시1교)은 국토부와 협의가 이루어지지 않아 구례 지구단위종합복구사업에서 제외하고 사업 추진 중이었으나
  - “댐 하류지역 감사원 감사” 결과 서시1교는 우리 군에서 추진하고, 서시교는 익산지방국토관리청에서 추진토록 통보('23. 1. 3.)

### ○ 서시1교 추진계획 (구례군)

- 예산확보: 132억 원(서시교, 서시1교)
  - 서시천(지방하천) 전체 예산 확보액 : 410억 원
- 사업기간: 2023. 3. ~ 2024. 4.

- 사업량: 교량승상 L=180m, H=1.2m, 접속도로 정비 L=1.57km
- 사업비: 85억 원(토목 78, 전기 1, 폐기물 6)

※ 서시1교는 “구례 지구단위종합복구사업(서시천)”으로 확보한 교량 예산(132억 원)범위 내에서 추진

- 추진현황 및 계획
  - 2023. 3.: 실시설계용역 착수
  - 2023. 8.: 실시설계용역 완료
  - 2023. 9.: 공사 착공
  - 2024. 4.: 공사 준공


#### ○ 서시교 추진계획 (익산청)

- 사업기간: 2023 ~ 2026
- 사업량: 교량 개축 L=150m(4차로), 교차로 개선 1식
- 사업비: 310억 원(공사비 300, 설계비 10)
- 추진현황 및 계획
  - 2023. 7.: 실시설계용역 착수(용역기간 12개월)
  - 2023. 10.: 주민설명회 개최 예정(2023. 10. 24.)
  - 2024. 7.: 실시설계용역 완료
  - 2024. 8. ~ 2026. 12.: 공사 추진

※ 용역사 : (주)경호엔지니어링 - 2023. 7. 5. 입찰

→ 서시교 개선 계획에 대해 익산청과 지속적인 협의 필요

# 위치도

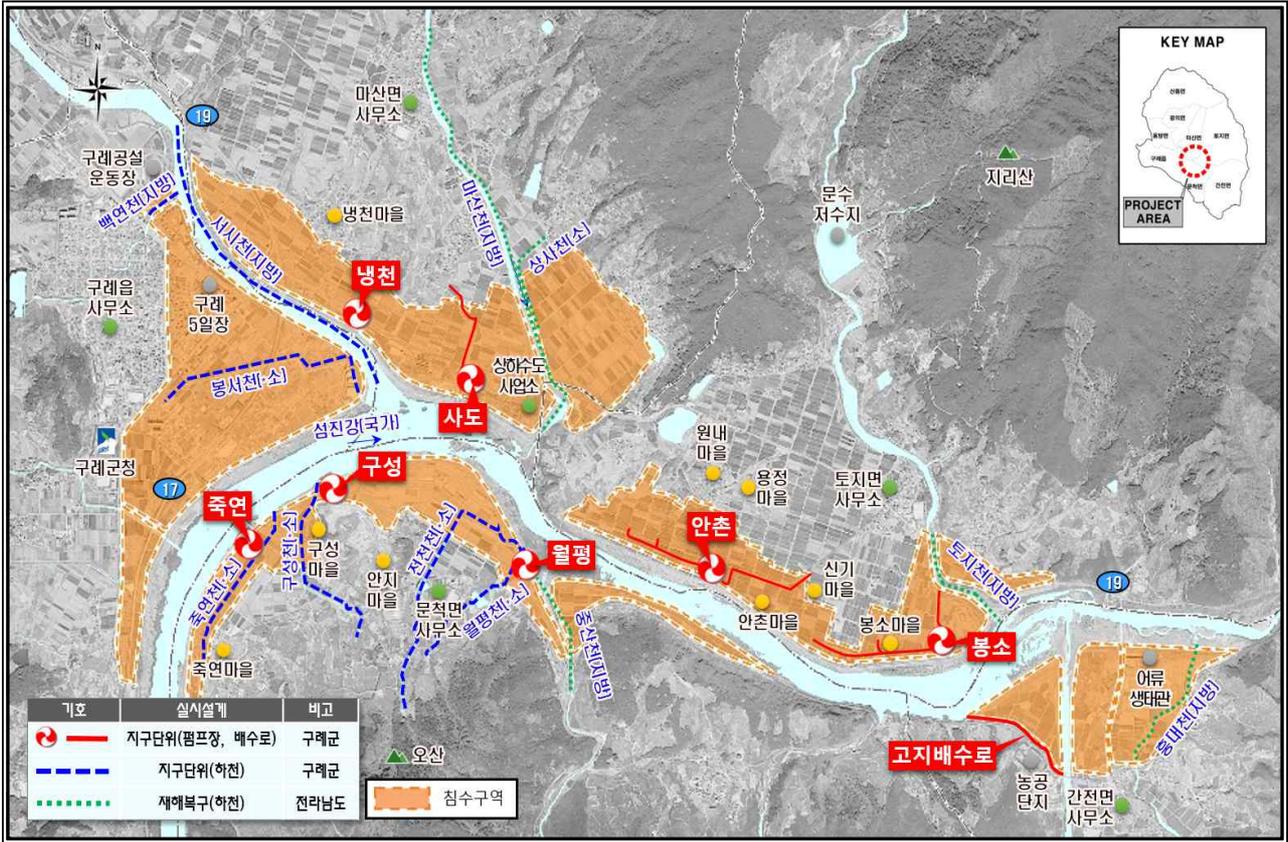

# 현황사진

## □ 배수펌프장 추진현황 사진

<p>- 공종 : 죽연 배수펌프장 / 건축 구조물공</p>	<p>- 공종 : 구성 배수펌프장 / 건축 구조물공</p>
<p>- 설명 : 배수펌프장 공사 전경</p>	<p>- 설명 : 배수펌프장 공사 전경</p>



- 공종 : 월평 배수펌프장 / 건축 구조물공  
- 설명 : 배수펌프장 공사 전경



- 공종 : 냉천 배수펌프장 / 건축외벽 공사 중  
- 설명 : 배수펌프장 공사 전경



- 공종 : 냉천 배수펌프장 / 배수펌프 설치 중  
- 설명 : 배수펌프장 기계설비 시공



- 공종 : 사도 배수펌프장 / 건축외벽 공사 중  
- 설명 : 배수펌프장 공사 전경



- 공종 : 안촌 배수펌프장 / 건축외벽 공사 중  
- 설명 : 배수펌프장 공사 전경



- 공종 : 봉소 배수펌프장 / 건축외벽 공사 중  
- 설명 : 배수펌프장 공사 전경

## □ 지방하천 추진현황 사진



- 공종 : 서시천 / 호안공  
- 설명 : 서시천 제방상부 조성 중



- 공종 : 백연천 / 호안공, 교량공  
- 설명 : 백연천 호안(옹벽), 교량 설치 중

## □ 소하천 준공 사진



- 공종 : 죽연소하천  
- 설명 : 공사준공 후 전경



- 공종 : 봉서소하천  
- 설명 : 공사준공 후 전경



- 공종 : 구성소하천  
- 설명 : 공사준공 후 전경



- 공종 : 진천 및 월평소하천  
- 설명 : 공사준공 후 전경

## P8-35 국도 18호선 확포장 국가계획 반영

국립공원 제1호 지리산을 찾는 관광객의 교통편의 제공 및 지역 남부내륙의 교통망 확충으로 국가균형 발전에 기여

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> ■	전남도 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	850(억 원)	<b>사업주체</b>	구례군 □ 기 타 □
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	100%	<b>추진부서</b>	건설과

### □ 사업개요

#### [구례군청~구례구역 구간]

- 위 치: 구례군 구례읍 ~ 순천시 황전면
- 사업량: L=4.5km, B=21.0m (기존 8.0m)
- 사업비: 765억 원(국비 764, 군비 1)
- 내 용: 4차선 확포장
- 사업주체: 국토교통부(익산지방국토관리청)

#### [구례구역~황전IC 구간]

- 위 치: 순천시 황전면
- 사업량: L=0.5Km, B=21.0m (기존 8.0m)
- 사업비: 85억 원(시비)
- 내 용: 4차선 확포장
- 사업주체: 순천시

## □ 예산계획

- 기본계획 및 타당성 분석용역비 200백만 원 확보
- 제6차 국토·국지도 5개년 계획 확정 후 예산확보 예정

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	85,100	-	-	200	-	-	-	84,900	200			200			
국비	76,400	-	-	-	-	-	-	76,400							
도비	-	-	-	-	-	-	-	-							
군비	200	-	-	200	-	-	-	-	200			200			
기타	8,500	-	-	-	-	-	-	8,500							

## □ 지금까지 추진사항

- 2020. 6.: 제21대 국회의원 선거 공약반영 요청
- 2020. 10.: 국회대응 현안사업 건의(전남도)
- 2020. 11.: 국회(지역구 의원) 방문 건의
- 2021. 4.: 도지사와 구례군민과의 대화 시 건의
- 2023. 3.: 제6차 국토·국지도 건설계획 수요조사 제출  
(구례군 → 전남도 → 익산국토관리청 → 국토교통부)
- 2023. 6.: 한국교통연구원 업무 협의
- 2023. 10.: 국토18,19호선 확포장 기본계획 및 타당성 조사용역 실시

## □ 향후계획

- 기본계획 및 타당성 분석 용역 추진(용역비: 200백만 원)
- 추후 제6차 국토국지도 5개년 계획에 반영되도록 건의(국회 등)

사업부서

건설과 양동필

도로시설팀장 이재근(2487)

담당자 최기원(2488)

□ 위치도



## P8-35 국도 19호선 확포장 국가계획 반영

국립공원 제1호 지리산을 찾는 관광객의 교통편의 제공 및 지역 남부내륙의 교통망 확충으로 국가균형 발전에 기여

<b>사업구분</b>	신규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>예산구분</b>	예산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국가 <input checked="" type="checkbox"/>
<b>완료시기</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	2,740(억 원)		전남도 <input type="checkbox"/>
<b>사업부서</b>	건설과 (도로시설팀)	과장 양동필 (2406)	팀장 이재근 (2487)	구례군 <input type="checkbox"/>	기타 <input type="checkbox"/>
				주무관 최기원 (2488)	

### 추진방향

- 제6차 국도국지도 5개년 계획(2026년 ~ 2030년)에 반영

### 사업개요

- 위 치: 구례군 토지면 외곡리 ~ 마산면 냉천리
- 사업량: L=14.5Km, B=21.0m (기존 8.0m)
- 사업비: 2,740억 원(국비 2,739 군비 1)
- 사업주체: 국토교통부(익산지방국토관리청)
- 사업내용: 4차선 확포장

### 예산계획

- 기본계획 및 타당성 분석용역비 200백만 원 확보
- 제6차 국도·국지도 5개년 계획 확정 후 예산확보 예정

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	274,000	-	-	100	-	-	-	273,900	100			100			
국비	273,900	-	-	-	-	-	-	273,900							
도비	-	-	-	-	-	-	-	-							
군비	100	-	-	100	-	-	-	-	100			100			
기타	-	-	-	-	-	-	-	-							

## □ 지금까지 추진사항

- 2023. 3.: 제6차 국도·국지도 건설계획 수요조사 제출  
(구례군 → 전남도 → 익산국토관리청 → 국토교통부)
- 2023. 6.: 한국교통연구원 업무 협의
- 2023. 10.: 국도18,19호선 확포장 기본계획 및 타당성 조사용역 실시

## □ 향후계획

- 기본계획 및 타당성 분석 용역 추진(용역비: 200백만 원)
- 추후 제6차 국도국지도 5개년 계획에 반영되도록 건의(국회 등)

□ 위치 도



# 안 전 교 통 과

**[P8-30] 공영버스 저상 전기버스 단계적 전환**

**[P8-38] 드론 LRS(Land, River, Sky) 실증 추진**

**[P8-25] 군청 ~ 경찰서 구간 보행환경 개선 (장기계획)**

농어촌버스를 저상 전기버스로 전환함으로써 안전하고 환경 친화적인 삶의 기반시설 확충 및 탄소중립 으뜸도시 실현

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 외 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	79(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b> 안전교통과

□ 사업개요

- 사업기간: 2023년 ~ 2040년
- 사업대상: (합)구례여객운수사
- 사업량: 18대
  - 임기 내: 3대(2023년 ~ 2026년) / 임기 외: 15대(2026년 이후)
- 사업비: 7,920백만 원(※ 대당 440백만 원)
  - 440백만 원(국토부 46, 도 23, 군 150, 환경부 121, 자부담 100)
- 사업내용: 매년 1대 이상 전기 저상버스 도입·전환

□ 지금까지 추진사항

- 2023. 02.: 2023년도 사업 수요 조사(군 → 구례여객)
- 2023. 02.: 2023년도 사업 미 신청(구례여객 → 군)
- 2023. 08.: 2024년도 전기저상버스 도입지원 수요조사(2대 도입)

□ 문제점 및 대책

- 운수회사(구례여객)의 자부담(1억원) 능력 결여로 사업 추진이 불확실하며, 운수회사 자부담 확보 시 사업 추진
- 자부담 확보능력이 결여된 현 상황에서 군수 공약사항으로의 추진은 재검토가 필요함.

□ **향후계획**

- 2023. 10.: 2024년도 보조금(국·도비) 교부 신청(군 → 전남도)
- 2024. 03.: 보조금 교부

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	20(억 원)	<b>추진부서</b>	안전교통과
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 □    일부추진 ■	<b>추진율</b>	10%		

□ 사업개요

- 기 간: 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 장 소: 구례군 섬진강 및 지리산
- 사 업 비: 20억 원(국도비 10, 군비 10)
- 내 용
  - 내수면(섬진강) 안전모니터링 드론시스템 구축 [River]
  - 지리산권역 안전모니터링 드론시스템 구축 [Sky, Land]
  - 드론 실증을 위한 드론 특별자유화구역 지정

□ 지금까지 추진사항

- 드론 특별자유화구역 2차 지정 공모(국토부) 선정
  - 선정기간: 2023. 7. ~ 2025. 6.(2년 단위 / 국토부 성과 평가 후 재지정)
  - 구 간: 섬진강 및 지리산 권역 3개소(구례읍 신월리 139-4, 문척면 죽마리 416-1, 토지면 내동리 924)
  - 내 용: 섬진강 내수면 지형도 제작 및 안전 예찰 활동 등 재난안전플랫폼 실용화 · 상용화 테스트
- 드론 특별자유화구역 실증 지원센터 확보
  - 장 소: 상하수도사업소 2층
  - 내 용: 드론 특별자유화구역 실증 지원센터 확보 및 통신망 구성

## □ 문제점 및 대책

- 정부 건축재정 운영에 따른 예산확보 불투명
  - 재난 드론관제 시스템 구축: 2024년 재난안전특교세 신청(10억)
  - 내수면(섬진강) 안전모니터링 실증사업 추진: 국토부 드론실증도시 구축사업 공모 참여(10억)
- 드론 자유화구역 활동을 위한 인프라 부족
  - 드론 특별자유화구역 실증 센터를 활용하여 드론 관련 인프라 구축

## □ 향후계획

- 2023. 12.: 드론자유화구역 인프라 구축
- 2024. 2.: 드론 실증도시 구축사업 공모(국토부) 참여
  - 지원예산: 10억(국토부 → 수행업체에 직접 교부)
  - 내 용: 드론 산업 육성 및 활성화를 위한 드론 활용 서비스 모델을 발굴 지원하는 드론 실증도시 구축사업

# 농 정 과

**[P8-13] 섬진강 리버파크 조성(양정 관광형 축사환경 조성)**

**[P8-42] 우리밀 복합화산업 육성**

**[P8-43] 읍면별 고부가가치 특화작물 육성**

**[P8-44] 농특산물 유통 채널 다양화**

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	10(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 □    일부추진 ■	<b>추진율</b>	%	<b>추진부서</b>	농정과

□ 사업개요

- 기 간: 2023. ~ 2025.
- 장 소: 구례읍 양정지구 일원
- 사업비: 10억 원
- 내 용: 양정지구 축사 및 환경정비, 지붕갤러리 조성 등

□ 지금까지 추진사항

- 문체부 남부권 광역관광 개발계획 신청(기획예산실) : 22. 12.
- 문체부 남부권 광역관광 개발계획 확정 : 23. 7.  
- 그린케이션 관광스태이(칠의대대 부지) 223억원 레인보우워크(수달생태공원) 106억원 확정

□ 문제점

- 당초 문체부 남부권 광역관광개발 중 칠의대대 부지와 연계하여 ‘지붕위의 갤러리’ 를 포함한 관광형 한우마을을 신청했으나 문체부 최종 검토에서 칠의대대 부지만을 대상으로 한 ‘그린케이션 관광스태이 사업’ 만 반영됨  
→ 타부처 공모사업이나 지방소멸대응기금 사업(‘25년)으로 추진 검토
- 축산농가의 고령화로 사업 참여 의식 저조  
- 60세 이상(14호), 70세 이상(12호)
- 양정지구 축사시설 이전 요구 등 부정적 의견 상존  
- 악취 발생 및 미관저해, 경영여건 악화

## □ 대책

- 양정지구 축사환경 개선 추진위원회 구성 및 전문가 컨설팅
- 사업설명회 등을 통해 참여독려 및 홍보

## □ 향후계획

- 양정지구 관광형 축사환경 조성사업 기본계획 수립: 24. 5. ~
- 중기지방재정계획 등 사전절차 이행: 24. 7. ~
- 양정지구 관광형 축사환경 조성사업 추진: 25. 1. ~

사업부서

농정과 김삼중

축산팀장 안도형(2442)

담당자 안도형(2442)

우리밀 6차 산업 기반을 구축하여 지역 특화산업으로 육성함으로써 지역경제 활성화 및 일자리 창출 기여

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	30(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	70%	<b>추진부서</b> 농정과

□ 추진방향

- 우리밀의 생산 - 제조·가공 - 관광 등 6차 산업이 집적된 농촌 융복합 지구로 지정하여 상생모델 구축
- 우리밀 지역특화산업 육성으로 “우리밀=구례” 이미지 선점 추진

□ 사업개요

- 사업명: 농촌융복합산업 지구 조성사업
- 사업기간: 4개년(2024 ~ 2027)
- 사업비: 30억 원(국비 15, 군비 15)
  - 연차별 국비지원(2억:4억:6억:3억)
- 사업내용: 지역특화산업공동인프라 구축 및 지역브랜드화 지원 등

□ 세부계획

- 농촌융복합산업 지구조성 사업 공모신청을 위한 계획수립
  - 공모신청 조건: 구례군 소유 시설의 보완·리모델링

- 구례군 농촌융복합산업지구 조성 계획

구 분	생산지구(광의면)	소비지구(구례읍)
사업자 (위탁사업)	- 광의면우리밀특품사업단 - 우리밀 생산자 단체	- 구례군
민관협력체계 · 지역브랜드화 (S/W)	- 우리밀 구입 차액지원 - 학교급식 지원	- 우리밀 축제 - 포장재, 신제품 개발 - 시니어 일자리 창출
공동인프라 구축(H/W)	- 우리밀가공공장, 주변 밀밭	- 구례읍(5일시장 일원) ※ 추가 및 변경 가능

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,000				400	800	1,200	600							
국비	1,500				200	400	600	300							
도비															
군비	1,500				200	400	600	300							
기타															

□ 지금까지 추진사항

- 청년창업농과 회의 개최(2022. 7. 26.)
- 우리밀 육성 종합계획수립(2022. 7. 28.)
- 우리밀 관계자 간담회(2022. 12. 12.)
- 전남도지사 우리밀 사업장 현장 시찰(2022. 12. 20.)
- 전남융복합산업지원센터 업무협약(2023. 1.)
- 우리밀 농촌 융복합지구 조성을 위한 연구 용역 착수(2023. 4. ~ 10.)

□ 향후계획

- 농촌융복합산업화 지구조성 사업 공모 추진(23. 12.)

사업부서

농정과장 김삼중(2410) 농식품유통팀장 박향숙(2378) 담당자 김태수(2379)

- 지역특성에 맞는 고소득 원예농산물의 생산기반 구축
- 기상 이변에 따른 한해·이상저온·병충해·유해조수 등의 피해가 매년 반복되고 피해 규모가 커지고 있어 이에 대한 예방대책이 요구됨.

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ 전남도 ■ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	26(억 원)	<b>사업주체</b>
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	20%	<b>추진부서</b> 농 정 과 (원예특작팀)

□ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(5개년)
- 사업량: 40ha, 40대, 100동(과수분야 재해예방시설 흡입식 마늘 건조장치, 비가림시설)
- 사업비: 2,646백만원(도비 156, 군비 1,415, 자담 1,075)
- 특화작물: 수박, 감자, 토마토, 마늘, 과수(단감) 등
- 재원비율: 보조 60%, 자담 40%(※ 마늘: 보조 50%, 자담 50%)
- 지원내용
  - 과수분야 재해예방시설(21,875천원 × 40ha = 876,000천원)
  - 흡입식 마늘 건조기(3,000천원 × 40대 = 120,000천원)
  - 비가림시설 200평형(100동) 25,000원 × 660㎡ × 100동 = 1,650,000천원

## □ 예산계획

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	2,646		188	703	706	541	508		891		188	703			
국비	-		-	-	-	-	-		-		-	-			
도비	156		14	37	37	37	31		51		14	37			
군비	1,415		94	382	384	285	270		476		94	382			
기타	1,075		80	284	285	219	207		364		80	284			

## □ 지금까지 추진사항

### <2023년도 1 ~ 3분기>

- 과수분야 재해예방시설 지원
  - 보조금 교부결정: 15명, 7.5ha, 172백만원
    - 보조금 지급: 5명, 1.3ha, 43백만원
- 흡입식 마늘 건조장치
  - 보조금 교부결정: 7대, 24백만원
    - 보조금 지급: 7명, 24백만원
- 특화작물 비가림하우스 설치 지원사업
  - 보조금 교부결정: 11명/22동, 194백만원
    - 보조금 지급: 4명/7동, 65백만원

## □ 향후계획

- 사업비 집행완료 및 정산보고: 2023. 12.

사업부서

농정과 김삼종

원예특작팀장 강봉완(2376)

담당자 하복순(2377)  
담당자 정지은(2382)

농특산물 유통 채널의 다양화를 통해 관내 우수 농특산물 및 가공 식품 업체의 판로확대 도모

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>전남도</b> <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	4.2(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 정상추진 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	100%	<b>추진부서</b> 농정과

사업개요

- 기 간: 2022. 6. ~ 2026. 12.
- 사업비: 428,000천 원(군비)
- 내 용: 농특산물 직거래 장터운영, 농산물 가공품 수출업체 지원 등

부문별 세부계획

- 구례군 농특산물 직거래장터 『노고달장』 운영
  - 사 업 비: 36,000천 원(군비)
  - 추진내용: 지역행사(벚꽃축제, 우리밀 &수제맥주 축제 등)와 연계하여 농특산물 직거래장터 운영
  - 일자별 행사

회차	행 사 일	장 소	비 고
1	3. 31. ~ 4. 2.(3일)	서시천체육공원 / 간전 남도대교 앞	구례 300리 벚꽃축제
2	4. 6. ~ 9.(4일)	산동 산수유축제장	구례 산동 캠핑 페스티벌
3	6. 3.(1일)	서시천체육공원	디저트 피크닉
4	9. 8. ~ 9.(2일)	공설운동장	아이언맨 구례(우리밀&수제맥주 행사)
5	11. 3. ~ 4.(2일)	마산 마실장	노고달장(예정)

○ 수도권 등 관외 직거래장터 추진 계획

- 사업비: 12,000천원(군비)
  - 농특산물 직판행사 부스사용료: 6,000천원
  - 농특산물 직판행사 참가자 실비보상: 6,000천원
- 지원대상: 관내 농식품 제조·가공업체
- 지원내용: 직거래장터 등 참가업체 부스비 및 실비 지원
- 연간 참여 계획

주 관	시 기	비 고
서울 양천구	3회(설맞이, 추석맞이, 김장철)	
서울 구로구	2회(설맞이, 추석맞이)	자매결연
부산 수영구	1회(어방축제)	자매결연
경기도 새에덴교회	6회	
전라남도	12회(인천 주말장터, 서울 압구정동 직거래 등)	

○ 농산물 가공품 수출 확대를 위한 맞춤형 수출업체 지원

- 아마존 입점업체 포장기·포장재 지원
- 수출제품 영양성분 분석비용 등 시험분석비 지원
- 수출용 팔레트 및 포장재 제작 등 지원

□ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	428	20	30	78	100	100	100		128	20	30	78			
국비															
도비															
군비	428	20	30	78	100	100	100		128	20	30	78			
기타															

## □ 지금까지 추진사항

### <2023년도 1 ~ 3분기>

- 직거래를 통한 국내 유통 활성화
  - 수도권 지역 소비자 초청 행사 추진(2023. 3.)
    - 도시 소비자 교류를 통해 지속가능한 도·농 연계 판로 개척
  - 농·특산물 직거래장터 『노고달장』 추진(2023. 3. ~ 6.)
    - 방문객: 약 3천여명 / 판매실적: 약 25백만 원
  - 『구례 산동 캠핑 페스티벌』 기간 농특산물 장터 추진(2023. 4.)
    - 방문객: 250팀(700명)
  - 수도권 등 관외 직거래장터 참여: 25회 참여, 113백만원 매출
- 해외수출을 통한 유통 활성화
  - 수출제품 영양분석비용 등 수출활성화 지원
    - 건농산물(애호박, 오이) 프랑스 수출 10백만원
    - 비빔밥키트 신제품 수출예정, 썩부쟁이며핀, 우리밀 건빵 등 미국 수출 진행
    - 김부각, 산수유청, 된장, 고추장 등 중국 수출 협의

## □ 향후계획

- 구례군 농특산물 직거래장터 『노고달장』 지속 추진
- 수도권 등 관외 직거래 장터 및 박람회 참여 확대 추진
  - 2023년 매출실적 200백만 원 달성 목표
  - 온라인쇼핑몰 『남도장터』 내 구례군 입점제품 대상 판촉 기획전 추진
- 수출활성화를 위해 농식품 수출 기업 지원을 위한 예산 확보 노력
  - 2023년 수출실적 200백만 원 달성 목표

사업부서

농정과장 김삼중

농식품유통팀장 박향숙(2378)

담당자 김태수(2379)  
담당자 김윤정(2381)

# 산 림 과

**[P8-20] 천년고찰 문화 탐방로 「무소유길」 조성**

**[P8-24] 섬진강 사계절 무지개 꽃길 조성**

**[P8-27] 견두산 MTB코스 개발 및 전국대회 유치**

**[P8-28] 걷기 좋은 길 「블루존 웨이」 코스 개발**

천은사·화엄사 등 지리산 자락의 주요 사찰을 연결하는 역사문화 탐방 숲길 개설

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>국 가</b> □ <b>사업주체</b> 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 ■
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	10(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	20%	<b>추진부서</b> 산림과 (산림휴양팀)

□ **추진방향**

- 천년고찰 명승인 화엄사교구(화엄사, 천은사, 연곡사) 선승께서 수련하던 옛길을 활용하여 순례객을 위한 108 무소유길 조성
- 건강과 정서함양을 위한 휴양·치유 목적의 역사문화탐방 숲길 조성

□ **사업개요**

- 사업기간: 2023년 ~ 2026년  
 (1단계 : 천은사 삼일암 ~ 화엄사 구층암 4.0km)  
 (2단계 : 화엄사 구층암 ~ 문수사 ~ 연곡사구간)
- 사업장소: 천은사 ~ 화엄사 ~ 문수사 ~ 연곡사
- 사 업 비: 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
- 사업내용
  - 국립공원 구역 탐방로 지정(정비) 위한 공원계획(변경) 반영
  - 지자체요구 공원계획 변경을 위한 기본구상용역 등 사전절차 이행
  - 옛길복원 및 임도·숲길을 활용한 노선 개발, 안전편의시설 설치 등

## □ 예산계획

○ 예산 미확보(2024년 균특전환사업 예산 신청 및 협의)

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	1,000					600	400								
국비															
도비	500					300	200								
군비	500					300	200								
기타															

## □ 지금까지 추진사항

- 2023. 3. 7.: 천은사~화엄사 연기암 옛길 구간 현장답사
- 2023. 3. 21.: 천은사 상생의길 옛길 구간 현장답사
- 2023. 3. 30.: 천은사~화엄사 구층암 옛길 구간 현장답사  
(군, 국립공원, 화엄사 관계자 등 10여명)

→ 화엄사 연기암 ~ 용혈암(0.9km) 공원계획 반영

## □ 향후계획

- 공원지역 공단 직접사업 및 탐방로 지정 공원계획변경 협의
- 화엄사 구층암~용혈암 노선 공원계획변경 신청 및 협의(24년 상반기)

## □ 문제점 및 대책

- 무소유길 노선이 국립공원 비지정탐방로로 공원계획 반영 애로  
(탐방로 이용도 따른 노선선정 및 탐방총량제 제한 중)
- 국립공원 계획에 탐방로 반영토록 지속적인 협의절차 진행
- 비 공원구역 송이, 고로쇠 등 임산물채취지로 사용승낙에 난항 예상

사업부서

산림과장 이성수

산림휴양팀장 (2249)

담당자 여인구(2752)

# 노선도



————— 계획노선     
 ————— 화엄사 옛길

섬진강과 서시천을 연결하는 계절별 꽃길 조성으로 주변 경관과 어울리는 다양한 볼거리 제공

<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기 추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	2.7(억 원)	<b>추진부서</b>	산림과 (산림녹지팀)
<b>추진상황</b>	완료 □ 정상추진 ■	완료 후 계속 □ 일부추진 □	<b>추진율</b>	10%	

□ 사업개요

- 기 간: 2023. ~ 2027.
- 장 소: 구례읍·문척면 섬진강변(양정배수펌프장~두꺼비다리)
- 사업비: 270백만 원(군비)
- 내 용: 구간별 계절꽃단지 조성(14ha)
  - 1단계구간: 섬진강정수장 ~ 대나무숲길 입구 ~ 두꺼비다리
  - 2단계구간: 구례양정배수펌프장 ~ 섬진강정수장



□ 예산계획

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	270	-	-	30	60	80	100	-	90	-	-	30	60	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	270	-	-	30	60	80	100	-	90	-	-	30	60	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진사항

- 2023. 6. : 섬진강 사계절 꽃길 조성계획 수립
- 2023. 7. ~ 8.: 계절꽃 식재기반 마련(두꺼비다리~대숲길 입구)
- 2023. 9. ~ 10.: 계절꽃 파종 추진(두꺼비다리~대숲길 입구)

□ 향후계획

- 2023. 10. ~ 2024. 3.: 계절꽃 식재지 사후관리
- 2024. 4. ~ 12.: 계절꽃 개화지 보식, 풀메기 등 유지관리

□ 문제점 대책

- 해당없음

사업부서

산림과장 이 성 수


산림복지팀장 (2308)

담당자 전명인(2554)

## 현황사진



## 위치도

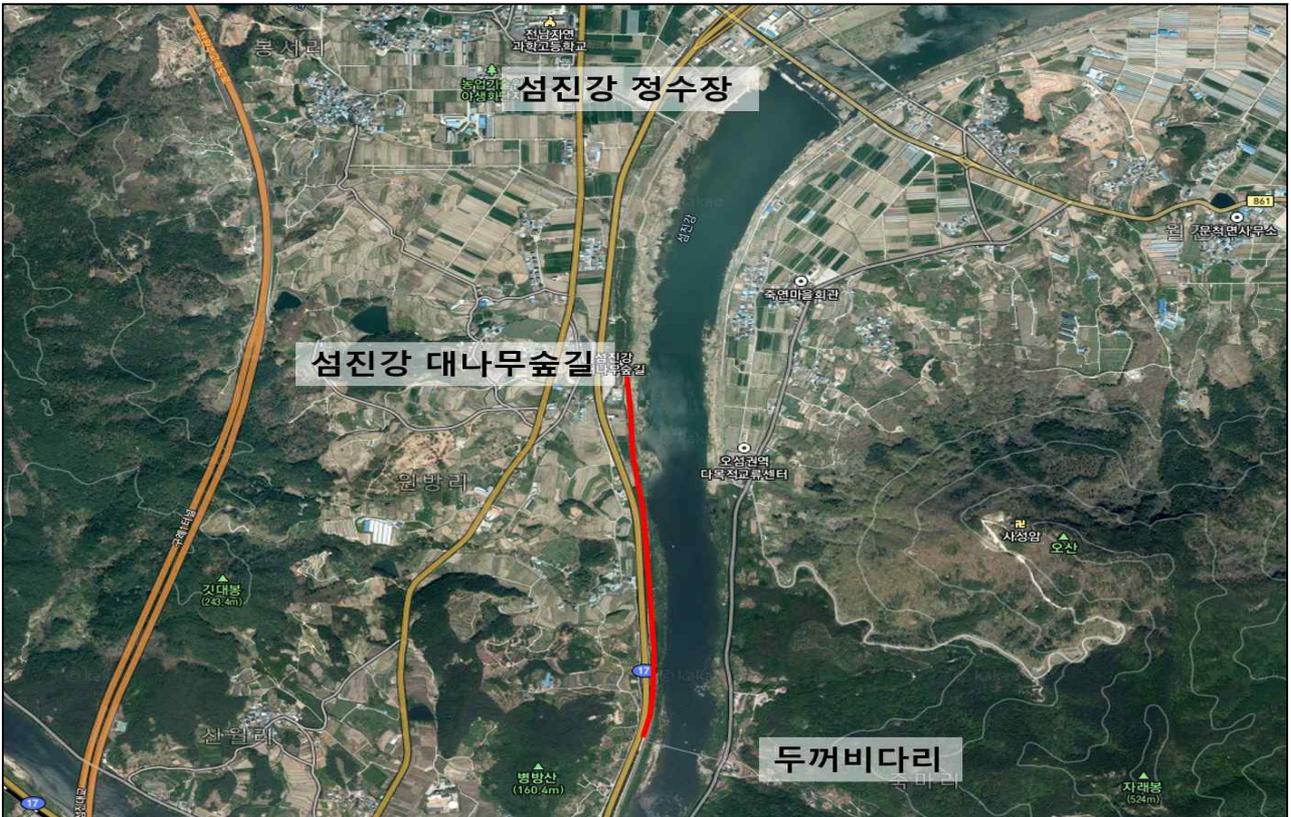

구례읍(누룩실재) ~ 견두산 ~ 산동 밤재 구간 MTB코스 개발 및 전국대회 유치로 산림레포츠 활성화에 기여

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 외 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	30(억 원)	<b>사업주체</b>
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%	<b>추진부서</b> 산림과 (산림휴양팀)

추진방향

- 차별화된 MTB코스 개발 등 산림레포츠 활성화 및 기반 확대
- 국내·외 MTB대회 유치 및 개최로 산림레포츠 메카 조성

사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2027년
  - 사업장소: 구례읍(누룩실재) ~ 견두산 ~ 산동 밤재
  - 사 업 비: 3,000백만원(도비 1,500, 군비 1,500)
  - 사업내용
    - 기존 임도 및 등산로와 연계하여 순환형 MTB코스 조성
    - 지리산정원 및 호수공원 등과 연계한 산림복합형 레포츠타운 조성
    - 국내·외 MTB대회 유치 및 각종 산림레포츠행사 개최 추진
  - 기타사항
    - 지초봉 산림레포츠시설(산악자전거)과 차별화된 코스조성 등 추진
    - 국립산림레포츠센터 유치와 연계하여 계획수립
- (※ 국립산림레포츠센터 유치 후 공약명칭 등 변경 검토)

□ 예산계획

○ 예산 미확보(2025년 균특예산 신청)

(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	3,000						200	2,800							
국비															
도비	1,500						100	1,400							
군비	1,500						100	1,400							
기타															

□ 지금까지 추진사항

- 2023. 5. 17.: 국립산림레포츠센터 산림청장 면담 건의(군수)
- 2023. 6.~10.: 국립산림레포츠센터 입지타당성용역 완료
- 2023. 7. 4. : 시·군 부단체장협의회시 국고사업 건의(정무부지사)
- 2023. 9.~10.: 서부권 국립산림레포츠센터 국고사업 건의(국회, 기재부)

□ 향후계획


- 국립산림레포츠센터와 연계하여 견두산 MTB코스 개발 계획수립
- 2025. 4.: 견두산 산림레포츠시설 전남도 예산협의
- 2025. 9.: 견두산 산림레포츠시설 기본구상 용역 등

□ 문제점 대책

- 대상지 내 사유림 사용승낙서 징구 애로 등으로 계획변경 불가피
- 산림레포츠 전문가 컨설팅 등으로 개발·운영시 문제점 최소화

사업부서	산림과장 이성수	산림휴양팀장 (2249)	담당자 여인구(2752)
------	----------	---------------	---------------

# 계획노선

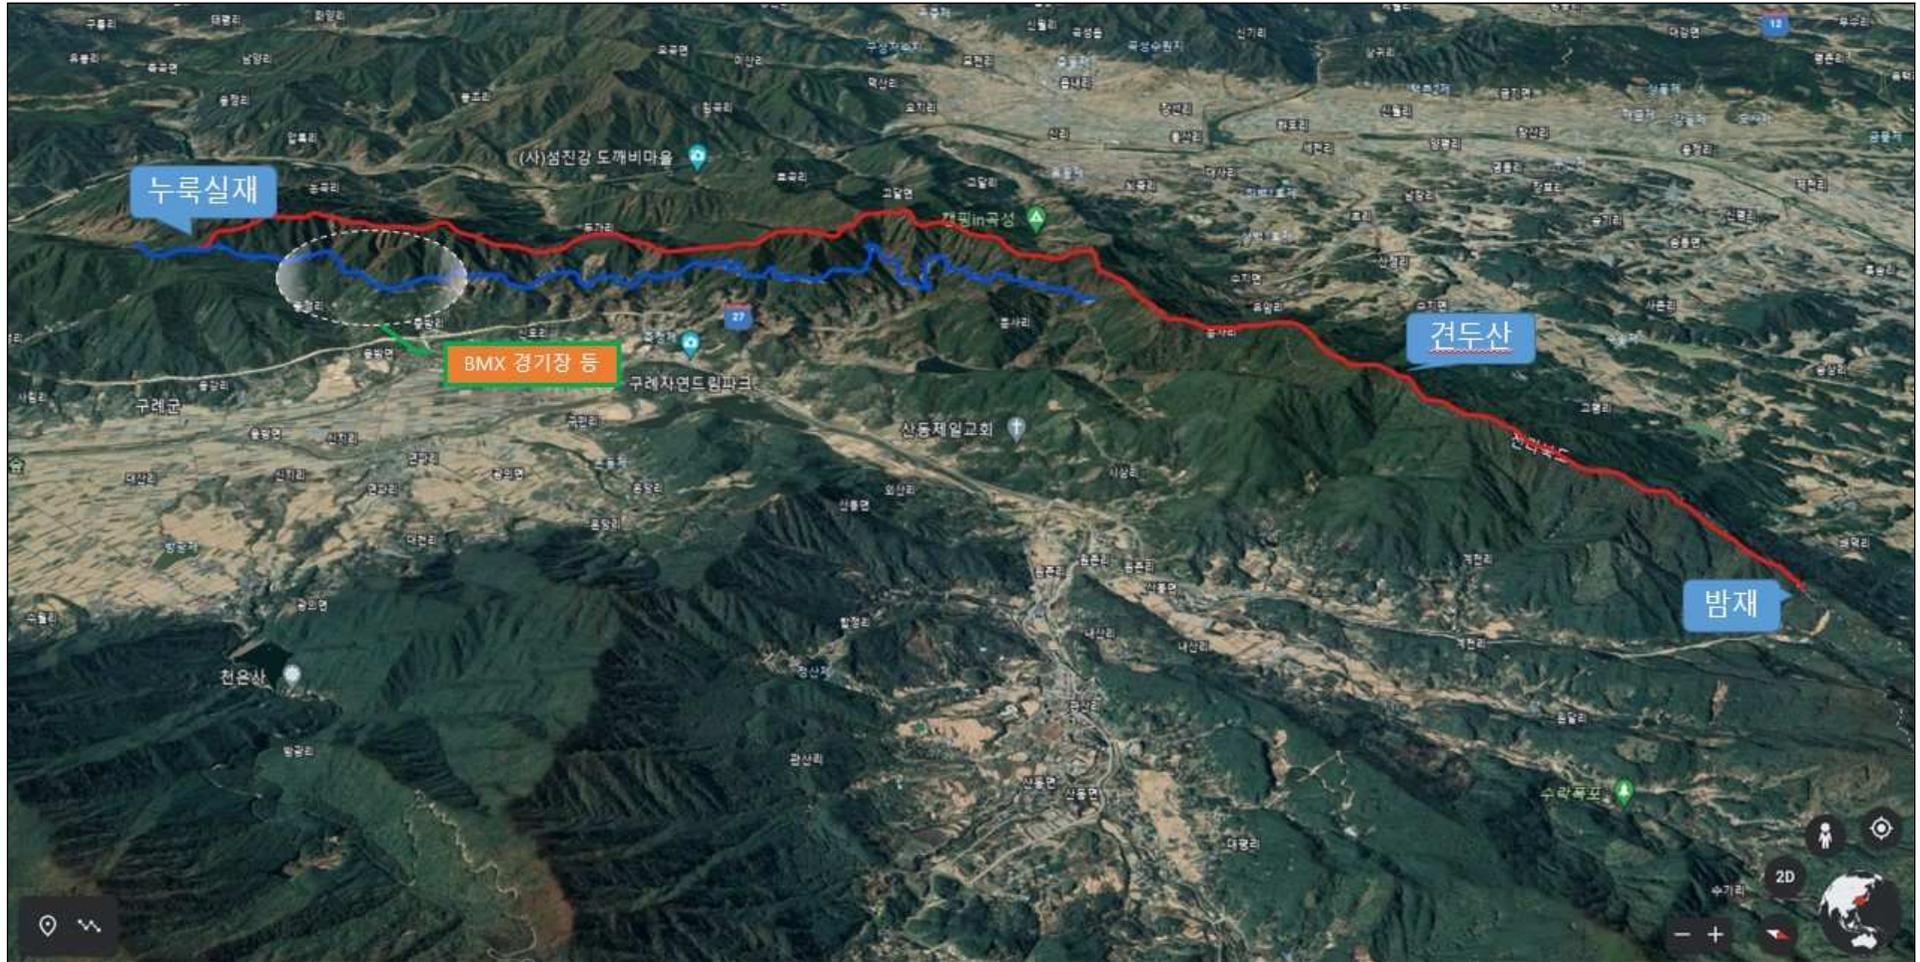

————— 전체 노선도   
 ————— 임도

구만제 수변 공원 등 숲길과 연계된 블루존웨이 개발로 남녀노소 부담없이 즐길 수 있는 숲산책로 코스 개발

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	5(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	10%		<b>추진부서</b> 산림과 (산림휴양팀)

**추진방향**

- 남녀노소 부담없이 즐길 수 있는 생활권 산책 숲길 조성
- 단순 걷기뿐만 아니라 요가·명상 등의 프로그램 반영

**사업개요**

- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 사업장소: 서시천 ~ 구만제 구간 등
- 사업비: 500백만원(도비 250, 군비 250)
- 사업내용
  - 지리산둘레길 및 이순신백의종군로, 구만제오토캠핑장·수변공원, 치즈랜드 등과 연계한 걷기코스 조성(문화관광실 연계)
  - 수변데크시설, 안전 및 편의시설 설치, 주변 경관·명상숲 조성
- 기타사항
  - 숲길 정비 등 운영·관리, 숲길체험 및 탐방 프로그램 운영 등
  - 단순 걷기뿐만 아니라 요가 등 치유프로그램·음식 등과 연계검토

□ 예산계획

- 2024년 균특전환사업 예산 반영(긴축재정 정책에 따라 조정가능)  
(단위: 백만원)

구분	투자계획								확보실적						
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	500				500				500				500		
국비															
도비	250				250				250				250		
군비	250				250				250				250		
기타															

□ 지금까지 추진사항

- 2023. 3. : 관계기관(농어촌공사 등) 협의
- 2023. 5. 18.: 2024년 균특전환사업 예산 사전심의(전남도)
- 2023. 7. : 2024년 균특전환사업 예산 반영(추가)

□ 향후계획

- 2023. 11.: 구만제 관리기관(농어촌공사) 협의
- 2024. 2.: 설계용역 등 추진

□ 문제점 대책

- 구만제 안전 및 기능상 농어촌공사 협의에 난항이 예상됨

사업부서

산림과장 이성수

산림휴양팀장 (2249)


담당자 여인구(2752)

## 현황사진



— 신규조성 — 지리산둘레길

## 현황사진

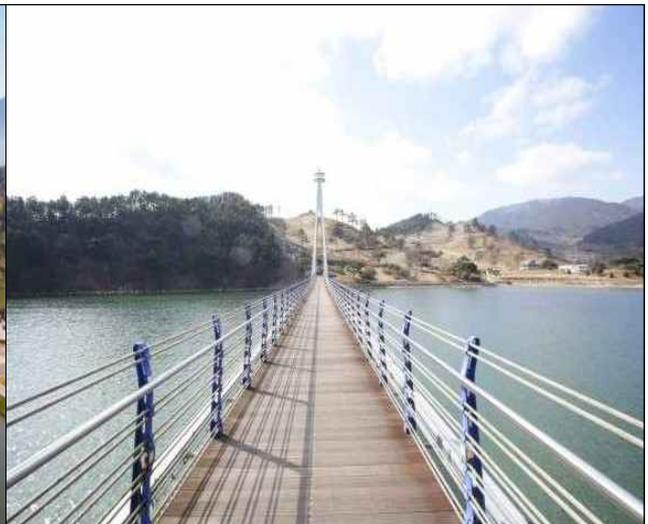

# 환 경 과

**【P8-18】 화엄 관광 르네상스 사업 추진(반달가슴곰보금자리 조성사업)**

**【P8-29】 탄소중립도시 실천 선도도시 조성**

- 사육곰 보호시설 조성으로 동물복지 실현
- 국내최초로 도입하는 생츄어리를 통한 화엄권역 관광 활성화 방안 모색

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input checked="" type="checkbox"/> 임기 외 <input type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> <b>사업주체</b> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	90(억 원)	
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	20%	<b>추진부서</b> 환경과

□ 사업개요

- 기 간: 2021. ~ 2024.
- 위 치: 구례군 마산면 황전리 산10-25 일원
- 대지면적: 28,208㎡(보금자리 24,582㎡, 진입도로 3,626㎡)
- 사 업 비: 90억 원(국비 45, 군비 45)
- 사업내용
  - 사육동(2동 637.6㎡), 검역동(316㎡), 사무실(381.7㎡)
  - 진입도로 개설 L=409m, B=8m

□ 지금까지 추진사항

- 2022. 11.: 행정절차 이행(소규모환경영향평가, 소규모재해영향성검토 등)
- 2023. 2.: 도 계약심사, 농지·산지전용허가 및 실시설계 용역 완료
- 2023. 4.: 조성사업(건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 감리) 계약의뢰
- 2023. 5.: 국립공원 구역 및 계획 변경 고시(환경부)
- 2023. 6.: 사업 착공(19일)
- 2023. 8.: 현장사무실 설치 및 사업부지 현황측량
- 2023. 9.: 부지 내 잡목제거, 수목이식 등 토목공사 추진

## □ 향후계획

- 2023. 12.: 군 관리계획 변경(자연환경보전지역 → 계획관리지역)
- 2024. 1.: 건축허가 완료 및 사육동 4동 건축신축공사 추진
- 2024. 8.: 사업 완료
- 2024. 12.: 사육곰(49마리) 입식 및 관리 등

사업부서

환경과장 윤효근 자연생태팀장 황선복(2986) 담당자 고재환(2987)

# 조감도

지리산 반달가슴곰 보금자리 조성



# 위치도



<b>사업구분</b>	신 규 ■ 기추진 □	<b>사업기간</b>	임기 내 ■ 임기 외 □	<b>사업주체</b>	국 가 □ 전남도 □ 구례군 ■ 기 타 □
<b>예산구분</b>	예 산 ■ 비예산 □	<b>사업비</b>	215(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 □    완료 후 계속 □ 정상추진 ■    일부추진 □	<b>추진율</b>	60%	<b>추진부서</b>	환경과

□ 사업개요

① 구례군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 (추진 중)

- 용역기간: 2023. 3. ~ 2024. 5.
- 사 업 비: 100백만 원(국비 70, 군비 30)

② 구례군 환경보전계획 수립 용역[신규] (추진 중)

- 용역기간: 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사 업 비: 30백만 원(군비)

③ 추진 중인 기타 사업

- 운행자동차 배출가스 저감정책
- 기후변화 및 미세먼지 대응정책
- 친환경자동차 민간 보급 정책
- 친환경자동차 가정용 완속충전기 설치 지원사업[신규]
- 친환경자동차 공공용 충전기 구축 지원사업
- 신재생에너지 구축 지원사업 ※ 시행부서 경제활력과

## □ 지금까지 추진사항

- 구례군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
  - 용역 착수: '23. 3. 6.
  - 구례군 2050 탄소중립녹색성장 위원회 구성: '23. 8. 21.
- 구례군 환경보전계획 수립 용역
  - 용역 착수: '23. 3. 27.
  - 환경계획수립협의회 구성: '23. 7. 19.
- 운행차 배출가스 저감사업 지원: 180대(조기폐차)
- 기후변화 및 미세먼지 저감사업 지원: 45대(친환경 5, 저녹스 40)
- 비산업 부문 온실가스 진단 사업: 48세대
- 전기자동차 민간 보급: 58대(승용 27, 화물 13, 이륜 17, 버스 1)
- 친환경자동차 공공용 충전기 구축 지원사업 착수
- 친환경자동차 가정용 완속충전기 설치 지원사업 착수
  - 사업비 확보: 15,000천 원(도 4,500, 군 10,500)
  - 사업 공고 및 대상자 선정: 15기
- 신재생에너지 융복합지원사업: 태양광 및 태양열 472개소
- 신재생에너지 주택지원사업: 태양광 12개소

## □ 향후계획

- 구례군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역
  - 2024. 1.: 중간 보고
  - 2024. 5.: 최종 보고 및 용역 완료
- 구례군 환경보전계획 수립 용역
  - 2023. 10.: 중간 보고
  - 2023. 12.: 최종 보고 및 용역 완료
- 2023. ~ 2026.: 운행자동차 배출가스 저감정책 연중 추진
- 2023. ~ 2026.: 기후변화 및 미세먼지 적응대책 연중 추진

- 2023. ~ 2026.: 친환경자동차 민간 보급 정책 연중 추진
- 2023. ~ 2026.: 친환경자동차 가정용 완속충전기 설치 지원사업 추진
  - 2023. 10. ~ 12.: 가정용 완속충전기 설치 완료 및 보조금 지급
- 친환경자동차 공공용 충전기 구축 지원사업
  - 2023. 10. ~ 12.: 전기자동차 충전시설 설치 및 운영
- 신재생에너지 구축 지원사업 추진
  - 2023. ~ 2026.: 신재생에너지 주택보급지원 사업 연중 추진
  - 2024. 1. ~ 12.: 2024년 신재생에너지 융복합지원사업 추진(442개소)
  - 2025. ~ 2026: 신재생에너지 융복합지원사업 공모신청 및 사업추진

사업부서

환경과장 윤희근    환경관리팀장 김학권(2151)    담당자 문지원(2154)

# 상하수도사업소

**【P8-36】 구례전역 지방상수도 공급**

**【P8-37】 하수도 보급률 향상**

미급수 지역에 깨끗하고 안전한 지방상수도 공급으로 수질사고 예방, 주민 보건위생 향상 및 주민 정주여건 개선 도모

<b>사업구분</b>	신 규 <input type="checkbox"/> 기추진 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 외 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>국 가</b> <input type="checkbox"/> <b>전남도</b> <input type="checkbox"/> <b>구례군</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>기 타</b> <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	463(억 원)	<b>사업주체</b>
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b> 40%	<b>추진부서</b> 상하수도사업소

### □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2035년
- 사업장소: 구례읍 산성리 등 5개읍 · 면 13개리
- 사 업 비: 463억원(국비 272, 도비 35, 군비 156)
- 사업내용: 상수관로 L=106.0km 등

#### - 미 급수구역(2023년 현재): 5개읍 · 면, 13개리

- 구례읍: 3개리(산성리, 계산리, 논곡리)
- 문척면: 1개리(중산리)
- 간전면: 3개리(운천리, 중대리, 금산리)
- 토지면: 5개리(송정리, 외곡리, 내서리, 내동리, 문수리)
- 산동면: 1개리(둔사리)

#### - 수도정비기본계획 **반영구역**: 3개읍 · 면, 9개리

- 구례읍: 1개리(산성리)
- 간전면: 3개리(운천리, 중대리, 금산리)
- 토지면: 5개리(송정리, 외곡리, 내서리, 내동리, 문수리)

#### - 수도정비기본계획 **미 반영구역**: 3개읍 · 면, 4개리

- 구례읍: 2개리(계산리, 논곡리)
- 문척면: 1개리(중산리)
- 산동면: 1개리(둔사리)

## □ 예산계획

(단위: 백만 원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	46,321	1,143	4,000	7,445	7,700	9,246	2,989	13,798	7,843	1,143	3,143	3,557	-	-	-
국비	27,188	800	2,800	5,478	5,390	6,472	2,092	4,156	5,490	800	2,200	2,490	-	-	-
도비	3,496	103	360	704	693	832	269	535	706	103	283	320	-	-	-
군비	15,637	240	840	1,263	1,617	1,942	628	9,107	1,647	240	660	747	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## □ 지금까지 추진상황

- 2023. 1. : 수도정비 기본계획(변경) 수립용역 군 계약심사 완료
- 2023. 5. : 간전면 2개리 지방상수도 확충사업 신규사업 신청
- 2023. 6. : 토지면 5개리 지방상수도 확충사업 공사 착공
- \* 수도정비기본계획('19. 2.)에 미반영 되어 있는 지역은 기본계획 변경 수립(5년 단위, '24. 10.) 이후 사업 추진  
→ 변경수립 후 2개면(문척, 산동면)은 국비 지원사업으로 연차적 추진

## □ 향후계획

- 2024. 1. : 간전면 2개리 지방상수도 확충사업 실시설계 용역 착수
- 2024. 4. : 간전면 금산리 지방상수도 확충사업 신규사업 신청
- 2025. 1. ~ 2026. 6. : 토지면 5개리 확충사업 공사 완료(추진율 40%)  
및 미반영 구역(문척 중산리, 산동 둔사리) 사업 추진

## □ 문제점 및 대책

- “환경부 수도시설 확충 개량사업 지침”에 따라 읍 지역(산성리, 계산리, 논곡리)은 국비지원 사업 제외  
→ 구례읍 3개리 지역은 군비 확보 후 연차적으로 추진

사업부서

상하수도사업소장 조정숙 상수도시설팀장 김철호(8115) 담당자 김성열(8116)

하수도법 제11조에 근거하여 하수도정비기본계획에 따라 공공하수도를 설치하여야 하며, 하수도의 효율적인 관리 및 공공수역의 수질보전 및 생활환경 개선에 목적이 있음.

<b>사업구분</b>	신 규 <input checked="" type="checkbox"/> 기추진 <input type="checkbox"/>	<b>사업기간</b>	임기 내 <input type="checkbox"/> 임기 외 <input checked="" type="checkbox"/>	<b>사업주체</b>	국 가 <input type="checkbox"/> 전남도 <input type="checkbox"/> 구례군 <input checked="" type="checkbox"/> 기 타 <input type="checkbox"/>
<b>예산구분</b>	예 산 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산 <input type="checkbox"/>	<b>사업비</b>	504(억 원)		
<b>추진상황</b>	완료 <input type="checkbox"/> 완료 후 계속 <input type="checkbox"/> 정상추진 <input checked="" type="checkbox"/> 일부추진 <input type="checkbox"/>	<b>추진율</b>	35%	<b>추진부서</b>	상하수도 사업소

□ 사업개요

- 기 간: 2020년 ~ 2026년
- 장 소: 구례군 문척면 죽마리 등 13개리
- 사업비: 504억원(국비 284, 도비 35, 군비 185)
- 내 용: 하수관로 L=33.5km

마을하수처리시설 9개소 725m<sup>3</sup>/일

- 사업 추진구역(2023년 현재): 4개 처리구역
  - 죽연지구: 죽마리(죽연, 사성암)
  - 원기지구: 내동리(죽리), 내서리(신촌, 원기)
  - 지하지구: 지천리(서당골, 어덕촌), 갑산리(버드실, 대평)
  - 원촌지구: 시상리(시랑)
- 실시설계 추진구역(2023년 현재): 2개 처리구역
  - 광의구만지구: 구만리(온당 전원마을, 산동 귀농귀촌)
  - 방광지구: 방광리(천은사)
- 하수도정비 기본계획 반영구역: 7개 처리구역
  - 평도지구: 내동리(연곡사, 피정의 집, 당치마을)
  - 아양지구: 구례읍(아양마을)

- 중산지구: 중산리(산치, 성자, 중기)
- 백운천지구: 운천리(백운천)
- 중한치지구: 하천리(중한치, 묘동)
- 내죽지구: 오미리(솔까꿈, 곡전제, 새뜸)
- 대촌지구: 수월리(지리산청소년수련관 앞, 새동네)

## □ 예산계획(소규모 13개소)

(단위: 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2022	2023	2024	2025	2026	2027 이후	계	기확보	2022	2023	2024	2025	2026
계	50,431	1,404	2,752	2,510	17,595	9,845	10,507	5,818	14,664	1,404	2,752	4,736	5,772		
국비	28,354	779	824	521	12,908	5,151	5,318	2,853	8,648	779	824	2,276	4,769		
도비	3,488	114	84	60	1,368	686	729	447	984	114	84	231	555		
군비	18,589	511	1,844	1,929	3,319	4,008	4,460	2,518	5,032	511	1,844	2,229	448		
기타	-	-	-	-	-	-	-	-							

## □ 지금까지 추진사항

- '23. 4.: 죽연, 원기, 지하, 원촌 '23년 국비 추가 확보
- '23. 6.: 방광지구 농어촌마을하수도 증설사업 실시설계 착수
- '23. 9.: 원기 소규모 '23년 국비 추가 확보

## □ 향후계획

- '24. 1.: 2025년 국비보조사업 신청
- '24. 1.: 평도지구 기본 및 실시설계 용역 착수
- '24. 6.: 죽연, 지하, 원촌 3개소 공사 준공
- '24. 7.: 광의구만, 방광지구 2개소 공사 착수
- '25. 1.: 평도지구 공사 착수
- '25. 4.: 원기 소규모 마을하수도 정비사업 공사 준공

사업부서

상하수도사업소 조정숙 하수도팀장 김형규(8130) 담당자 박용규(8131)
